



MINISTÈRE
DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Projet "PRISE"
PROJET P-CD-E00-006



AFRICA DEVELOPMENT
BANK GROUP

Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-Economiques
dans la Region du Centre de la RDC
Projet "PRISE II"

RAPPORT ANNUEL 2025 DES ACTIVITES



JANVIER 2026

Sommaire

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES	3
PREAMBULE	5
I. PRESENTATION DU PROJET PRISE II	7
I.1. APERÇU GÉNÉRAL	7
I.2. DONNÉES DE BASE DU PROJET	7
I.3. ZONE D'INTERVENTION DU PROJET	8
I.4. DESCRIPTION DU PROJET	9
II. RAPPEL DES ACTIVITES DU PRISE II AU 31 DECEMBRE 2024	13
III. ACTIVITES REALISEES EN 2025	14
III.1 Détail des exécutions physiques de 2025 suivant les catégories des activités	15
IV. SITUATION DES REALISATIONS FINANCIERES DU PRISE II 31 DECEMBRE 2025	18
V. ASPECTS TRANSVERSAUX	25
V.1. SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE	25
V.2. GENRE :	27
VI. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET LES EVENEMENTS SAILLANTS AU COURS DE L'ANNEE 2025 .	28
VII. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS ENVISAGEES	29
VII.1. DIFFICULTES	29
VIII.2. SOLUTIONS	29
ANNEXES	30
ANNEXE : CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DE PRISE II	31

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES

ACE	:	Agence Congolaise de l'Environnement
ACF	:	Appel à Consultation des Fournisseurs
AEP	:	Alimentation en Eau Potable
AEPA	:	Alimentation en Eau Potable et Assainissement
AMI	:	Avis à Manifestation d'Intérêt
ANO	:	Avis de Non Objection
AO	:	Appel d'Offres
AOI	:	Appel d'Offres International
AON	:	Appel d'Offres National
APD	:	Avant-Projet Détaillé
APS	:	Avant-Propos Sommaire
ASUREP	:	Association des Usagers de l'Eau Potable
AT	:	Assistance Technique
BAD	:	Banque Africaine de Développement
CDFO	:	Congo Democratic Field Office
CEP –O	:	Cellule d'Exécution des Projets Eau de la REGIDESO
CFEN	:	Consultation de Fournisseurs à l'Echelon National
CI	:	Consultation Individuelle
CM	:	Commission des marchés
CMFG / CMG	:	Centre Multifonctionnel Genre
CN	:	Coordination Nationale
DAC	:	Dossier d'Appel à Consultation
DAO	:	Dossier d'Appel d'Offres
DAOI	:	Dossier d'Appel d'Offres International
DAON	:	Dossier d'appel d'offres national
DNO	:	Demande de l'avis de Non Objection
DP	:	Demande de Proposition
DPD	:	Demande de Paiement Direct
DRF	:	Demande de Reconstitution des Fonds
DSCR	:	Document de Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
EAPA	:	Expert en Alimentation en Eau Potable et Assainissement
EIES	:	Etude d'Impact Environnemental et Social
FAD	:	Fonds Africain de Développement
FEF	:	Facilités en faveur des Etats Fragiles
FIEK	:	Forum International sur l'Eau à Kinshasa
GEFAE	:	Genre Famille et Enfant
HIMO	:	Haut Intensité de Main d'œuvre
IEC	:	Information Education Communication
KFW	:	Kreditanstalt Für Wiederaufbau (Coopération Financière Allemande)
KKC	:	Kasaï, Kasaï Central
KORLS	:	Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru
KOC /KOCC	:	Kasaï Occidental
KOR	:	Kasaï Oriental
LAE	:	Lutte Anti Erosive
LBS	:	Liste des Biens et Services
LR	:	Liste Restreinte
MECNT	:	Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
MIN-ENER	:	Ministère de l'Energie
MI	:	Manifestation d'Intérêt

MDC	:	Mission de Contrôle
OHADA	:	Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
OMD	:	Objectifs du Millénaire pour le Développement
OVD	:	Office de Voirie et Drainage
PAESU	:	Projet d'Appui en Approvisionnement de l'Eau dans le milieu Semi Rural
PGES	:	Plan de Gestion Environnemental et Social
PM	:	Passation des Marchés
PPM	:	Plan de Passation des Marchés
PNA / DAS	:	Programme National d'Assainissement / Direction d'Assainissement du MECNT
PRISE	:	Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-Economiques dans la Région Centre de la RDC
PTBA	:	Programme de Travail et Budget Annuel
PTF	:	Partenaire Technique et Financier
RDC	:	République Démocratique du Congo
REGIDESO	:	Régie de Distribution d'Eau (de la RD Congo)
RWSSI	:	Rural Water Supply and Sanitation Initiative
SBQC	:	Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
SED	:	Selection par Entente Direct
ST	:	Spécifications Techniques
TDR	:	Termes de Référence
UC	:	Unité de compte (du Groupe de la Banque Africaine de Développement)
UEP	:	Unité d'Exécution du Projet
USD	:	United States Dollar (Dollar American)

PREAMBULE

Le Projet de Renforcement des Infrastructures Socioéconomiques PRISE II est la deuxième Phase du projet PRISE, un projet qui a été financé à la hauteur de 158 Millions d'USD pour une période initiale de 5 ans et devait se clôturer le 30 juin 2019 mais son délai a été prorogé successivement jusqu'au 30 juin 2021 étant donné que les travaux d'AEP tant en milieu rural que urbain n'étaient pas achevés, il y a eu une autre prorogation de 24 mois à la demande du Gouvernement devant permettre l'exécution complète des travaux d'AEP.

Ainsi la clôture de la phase 1 du PRISE est intervenue le 31 décembre 2023 avec à son actif plusieurs réalisations à savoir la construction de 60 centres de santé, de 60 écoles ; 60 AEP en milieu rural ; d'amélioration d'adduction d'eau de la ville de Mbuji-Mayi par la construction de 2 grands châteaux d'eau avec une capacité de 1420 m³ chacun, la pose de plus de 300 Km de la tuyauterie de diamètres différents, la construction de 500 bornes fontaines dans la commune péri-urbaine de Mbuji-Mayi, plus de 6000 branchements particuliers urbains ; la construction de 505 latrines publiques en milieu rural ; la construction du Centre Multifonctionnel Genre de Mbuji-Mayi ; la lutte antiérosive de la ville de Tshikapa par la construction d'environ 8 Km de route en chaussées souple et rigide.

Toutes ces réalisations ont été accueillies avec joie par les bénéficiaires et constituent un modèle de développement de nos milieux ruraux et péri-urbains, qui a justifié la mise en place de la deuxième phase du projet PRISE baptisé PRISE II (Projet de Renforcement des Infrastructures Socioéconomiques II).

Le PRISE II finance les infrastructures d'AEP, d'éducation, d'assainissement et de santé en milieu rural et péri-urbain. Il a été identifié à partir du Programme National d'Alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural élaboré sur financement du FAD dans le cadre du Projet Eau et Assainissement en milieu Semi-Urbain (PEASU) et dont PRISE 1 constitue le début de mise en œuvre.

Conformément aux dispositions des accords du prêt FAD qui régissent le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques (PRISE II), ce dernier a l'obligation de présenter à la fin de chaque année le rapport d'activités de l'année précédente ainsi que le Programme de Travail et le Budget de l'année suivante.

Il est à signaler que le projet « PRISE II » a deux sources de financement qui sont le Prêt FAD pour un budget de 50 000 000 UC équivalent à 71 438 500 USD et une contrepartie du gouvernement de la RD Congo pour un budget de 5 770 000 UC équivalent à 8 244 003 USD. Le budget global est de 55 770 000 d'UC équivalant à 79 682 503 USD au taux de l'accord de 1 UC = 1,42877 USD.

Les activités suivantes ont été prévues dans le cadre de la mise œuvre du projet PRISE II :

- **la composante de développement des infrastructures** dans **la catégorie des travaux** par la construction 41 écoles, 40 centres de santé, 88 latrines puis 208 autres en prenant en compte les latrines construites dans les écoles, les centres de santé et dans les places à vivre, installation de 21 mini-réseaux d'AEP en milieu rural, la construction des bureaux pour des Régies provinciales de l'eau l'une à Mbuji-Mayi et l'autre à Kananga; puis dans **la catégorie services**, l'activité de contrôle et surveillance des travaux de construction des écoles, centres de santé, latrines publiques et espaces à vivre, l'activité de contrôle et surveillance des travaux AEP rural et l'activité d'Information Education et Communication ; en suite dans **la catégorie des biens** par l'activité d'acquisition et d'équipements des écoles en mobiliers scolaires et l'activités d'acquisition et d'équipement des centres de santé en équipements médicaux.
- **La composante de renforcement des capacités**, l'acquisition des matériels roulants, mobilier de bureaux, matériels informatiques dans la catégorie services, l'activité de renforcement des capacités des acteurs, l'activité d'études et assistance aux réformes du secteur AEPA dans la catégorie services.

- **La Composante de la coordination et gestion** concerne les activités des consultants ponctuels du projet, les différents audits ; l'actualisation des Manuels des procédures et indemnités du personnel du projet et fonctionnement de la gestion courante du Projet.

A ce jour, les contrats de construction de bâtiments scolaires, de centres de santé, d'espaces à vivre, de bureaux de régies provinciales de l'eau, d'espaces à vivre ainsi que ceux de mini-réseaux AEP ont été signés et l'exécution des travaux se poursuit sur tous les sites identifiés et retenus.

Il est à signaler que le démarrage des travaux de 19 mini-réseaux d'AEP en milieu rural a débuté depuis le mois d'avril 2025 avec les essais des débits des forages et les contrats pour le 7ème Lot de 3 AEP de la Province de Lomami seront signés ultérieurement.

Pour les biens, quelques contrats ont été signés afin d'acquérir des matériels informatiques pour la Coordination de l'UEP PRISE, les matériels informatiques pour la CSPP/Finances, les mobiliers et équipements de bureau pour l'UEP/PRISE, mobiliers et équipements de bureau pour la CSPP/FINANCES, les matériels roulants pour l'UEP-PRISE/DIAR, pour la CSPP, pour les différentes brigades d'assainissement. Tandis que le contrat d'acquisition des équipements des maternités ciblées a été signé au mois de juillet de cette année 2025.

Dans la catégorie service 4 contrats ont été signés pour les consultants, le premier qui s'occupe du volet environnement pour lequel son contrat a été clôturé de même que pour l'actualisation de manuel de gestion financière du Projet. Le dernier en cours est celui de l'expert en eau et assainissement qui est signé en août 2024 qui est prorogé pour une année.

I. PRESENTATION DU PROJET PRISE II

I.1. APERÇU GÉNÉRAL

La deuxième phase du Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques (PRISE) dans la Région du Centre est conforme au PNEHA 2030 visant à accroître le taux d'accès à l'eau potable de 33% à 80%, à améliorer l'assainissement et l'hygiène pour tous ainsi qu'à éradiquer la défécation à l'air libre pour le quintile le plus pauvre d'ici 2030 moyennant un investissement de plus ou moins 7 milliards de dollars américains 0,7 Milliard investissement par an (*Africa Finance Minister's Meeting November 2020-country over view*) et le Projet PRISE s'inscrit dans cette dynamique gouvernemental avec l'appui de la Banque Africaine de Développement qui vise à l'amélioration des conditions socio-économiques et sanitaires ainsi que la résilience des populations congolaises à :

- (i) améliorer le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les zones rurales et péri-urbaines des provinces ciblées ;
- (ii) améliorer les taux de scolarisation et d'accès aux soins de santé des populations ; et
- (iii) renforcer la capacité des différents acteurs du secteur. Les bénéficiaires directs des résultats du projet sont les populations rurales estimées à 870 908 personnes réparties dans 10 provinces de la RDC.

D'un coût total de 55,77 millions d'UC dont 50 millions financé par un prêt FAD et 5,77 millions par la contrepartie du gouvernement. Le projet sera exécuté sur une période de 5 ans.

Les bons résultats enregistrés dans 5 provinces pendant la première phase et la seconde phase en cours ont poussé le gouvernement à élaborer un programme similaire dans 26 provinces de la RDC à travers PADER (Programme d'Appui au développement Rural lancé le 3 janvier 2025 dernier).

Le Projet PRISE II visera à améliorer les indicateurs généraux de santé dans le pays à travers un accès durable, à l'éducation, à l'assainissement et à l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène par la construction des 22 AEP, 41 écoles, 40 centres de santé et 88 latrines, contribuant ainsi à l'amélioration de la résilience des populations face au changement climatique.

I.2. DONNÉES DE BASE DU PROJET

Emprunteur : Gouvernement de la République Démocratique du Congo.

Organe d'exécution : Secrétariat Général du Développement Rural 1211, croisement des avenues le Premier Mall (Ex TSF) et lieutenant-colonel Lukusa Commune de la Gombe/Kinshasa République Démocratique du Congo

Email : developpementr@gmail.com

Sources de financement :

- Montant (UC) Instrument FAD : 50,00 millions (Prêt FAD).
 - Montant (UC) Gouvernement 5,77 millions contrepartie du Gouvernement.
- Coût total : 55,77 millions en (UC)

Durée-principales étapes (Attendues)

- Approbation de la note conceptuelle : Aout 2021
- Approbation du projet : Décembre 2021
- Signature de l'accord de prêt : Mars 2022
- Entrée en vigueur : Avril 2022
- Dernier décaissement : Avril 2027
- Achèvement décembre : 2026

I.4. DESCRIPTION DU PROJET

I.4.1. But et Objectif du projet.

Le Projet a pour objectif global de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations congolaises. Plus spécifiquement, il vise à assurer un accès durable et inclusif des femmes et des hommes de la Région du Centre de la RDC à l'eau potable, l'assainissement, la santé, l'éducation et aux emplois.

I.4.2. Composantes et objectifs spécifiques

Pour atteindre ces objectifs, les principales actions retenues par le Projet sont regroupées dans les trois composantes ci-après :

- Composante A : Développement des infrastructures (AEPA, écoles, Centres de Santé, Latrine publique.)
- Composante B : Etudes et Renforcement des capacités
- Composante C : Coordination et Gestion du projet

I.4.3. Activités du Projet PRISE II par composante et sous composante avec leurs coûts

Les activités à réaliser par le Projet sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Activités du PRISE par composante et sous composante.

Composantes	Activités	Coût en UC
A) Développement des infrastructures	Réalisation de 22 systèmes d'AEP en milieu rural avec énergie solaire/thermique	38.718.108 (69,42%)
	Construction et équipement de 41 écoles avec latrines et éclairage photovoltaïque	
	Construction et équipement de 40 centres de santé y compris éclairage photovoltaïque,	
	Construction de 40 Espaces à Vivres (marchés)	
	Construction de 88 latrines publiques	
	Construction et équipement de deux bâtiments pour les régies provinciales	
	Suivi et contrôle des travaux d'AEP en milieu rural et de construction des écoles, centres de santé, espaces à vivre et latrines publiques	
	Campagne d'IEC (hygiène, l'eau, sante, genre, assainissement et la pérennisation des infrastructures réalisées)	
B) Études et Renforcement des capacités	Formation des jeunes en plomberie et entretien des ouvrages d'AEP et d'assainissement	8.811.593 (15,80%)
	Formation sur le logiciel de gestion financière	
	Sensibilisation des acteurs locaux et ONG sur l'hygiène et la salubrité et à la Maitrise d'ouvrage des infrastructures d'AEPA	
	Formation des cadres du Ministère des Ressources hydrauliques, Développement rural et agents du CNAEHA en gestion d'une base de données	
	Formation des Brigades d'Assainissement (BA) et des Techniciens de l'Environnement (TE) ainsi que les Facilitateurs Communautaires (FC)	
	Formation des Autorités Provinciales Administratives pour leur implication aux activités de lutte contre la défécation à l'air libre dans les sites du projet	
	Campagne locale d'IEC pour le changement de comportement en Genre sur l'hygiène, l'assainissement et la nutrition	
	Promotion d'actions intégrées WASH, Santé et Nutrition :	
	- au niveau individuel et du ménage : Campagnes d'information et de sensibilisation sur les comportements WASH qui limitent la transmission oro-fécale et permettent d'éviter les maladies - au niveau communautaire : Mise en œuvre de l'ATSM (Assainissement Total et Sanitation Marketing) qui combine l'ATPC et le Marketing de l'assainissement.	

Composantes	Activités	Coût en UC
	Identification, structuration et formalisation des PME des femmes et des filles en vue dans les rendre éligibles au financement AFWA ; et leur Formation en entrepreneuriat, en NTIC, en recherche de financement... ainsi que la promotion d'AGR (genre et création d'emplois) autour d'une agriculture durable et adaptée au climat avec une gestion adéquate de l'eau et des sols	
	Appui à la mise œuvre du plan genre (volets formation et apprentissage des femmes et des filles, et violences faites aux femmes) de la RDC.	
	Voyages d'échanges des bénéficiaires du CMG à l'intérieur du pays, dans la sous-région et en Afrique de l'ouest.	
	Voyages d'études dans la sous-région	
	Renforcement des capacités des acteurs (l'appui à la mise en place de la délégation de service publique (aspects institutionnels, règlementaires et légaux, recrutement et opérationnalisation y compris monitoring))	
	Etudes et assistance aux réformes du secteur AEPA (maitrise d'œuvre)	
	Etude de la vulnérabilité climatique du projet	
	Renforcement des capacités sur le changement climatique lié au secteur de l'approvisionnement en eau	
C) Coordination et Gestion du Projet	Fonctionnement (acquisition logistiques, bureautiques et informatiques, logiciel de comptabilité, frais de missions, rémunération personnel national et DPO du projet, consommables, carburant...), pour l'UEP du projet et ses bureaux de Pools,	8.240.299 (14,78%)
	Actualisation du manuel des procédures du PRISE.1	
	Services d'assistance technique pour la mise en œuvre du Projet,	
	Suivi Environnemental et social et Audit environnemental et social	
	Missions Audits des comptes, environnemental et des acquisitions.	

I.4.4. DÉTAILS DES COÛTS DU PRISE PAR ACTIVITÉ DES RESSOURCES DU PROJET.

Tableau 2 : Coûts des activités par composante et par source de financement (en millions d'UC).

COMPOSANTE A - DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES		COMPOSANTE B - AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE SECTORIELLE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES					
Catégories	Prêt FAD	Catégories	Prêt FAD	Gouvernement	Catégories	Coûts	
A1 TRAVAUX		B1 BIENS			C1 SERVICES		
A1.1 Construction des mini-réseaux d'AEP en milieu rural	12 010 331	B1.1 Matériel roulant	513 729		C 1.1 Honoraires Consultants ponctuels du projet	331 754	
A1.2 Réhabilitation et Construction des Ecoles primaires	5 452 242	B1.2 Mobilier de bureaux	59 117		C 2.4 Audit des comptes, Acquisitions et Manuels	2 072 099	1 499 300
A1.3 Réhabilitation et construction des Centres de Santé	4 479 377	B1.3 Matériels Informatiques	35 765				
A1.4 Réhabilitation et Construction des Espace à vivre	6 999 027	B1.4 Equipements Divers	258 964				
A1.5 Construction des latrines publiques	911 553						
A1.6 Construction des Bureaux pour les régies provinciales	279 961						
Sous-total A1	30 132 492	Sous-total B1	867 575		Sous-total C1	2 403 853	1 499 300
A2 SERVICES		B2 SERVICES			C2 FONCTIONNEMENT		
A2.1 Contrôle et surveillance des travaux de construction des écoles, centres de santé, latrines publiques et espaces à vivre	419 942	B.2.1 Renforcement des capacités des acteurs	1 294 515	644 683	C 1.2 Indemnités du personnel du projet	2 114 826	
A2.2 Contrôle et surveillance des travaux AEP Rural	1 749 757	B.2.2 Etudes et assistance aux réformes du secteur AEPA	5 848 449	3 100 000	C2.1 Frais de missions et voyages	712 291	
A2.3 Campagne d'IEC	765 656				C2.2 Frais de fonctionnement des véhicules et moto du projet	1 274 523	
					C2.3 Frais divers de gestion	419 531	1 472
Sous-total A2	2 935 355	Sous-total B2	7 142 964	3 744 683	Sous total Fonctionnement	4 521 171	1 472
A3 BIENS							
A3.1 Mobiliers scolaires	542 355						
A3.2 Equipements médicaux	1 588 079						
Sous-total A3	2 130 434						
Coût de base composante A	35 198 280	Coût de base composante B	8 010 539	3 744 683	Coût de base composante C	5 990 409	1 500 771
Imprévus physiques	2 463 880	Imprévus physiques	560 738	262 128	Imprévus physiques	419 329	105 054

Hausse des prix	1 055 948	Hausse des prix	240 316	112 340	Hausse des prix	179 712	45 023
Total Composante A	38 718 108	Total Composante B	8 811 593	4 119 151	Total composante C	6 589 450	1 650 849
Coût de base du Projet	45 454 545				5 245 454		
Imprévus physiques	3 181 818				367 182		
Hausse des prix	1 363 636				157 364		
Total coût du Projet	50 000 000 (part de Prêt FAD)				5 770 000 (Part du gouvernement)		

II. RAPPEL DES ACTIVITES DU PRISE II AU 31 DECEMBRE 2024

Le projet est entré en vigueur avec la signature de l'accord du Prêt FAD le 01 mars 2022 mais le premier décaissement n'était intervenu qu'à la date du 10 janvier 2023 soit une année après la signature des accords ce qui implique une année de retard dans l'avancement du projet.

Durant l'année 2022, l'essentiel était focalisé dans la négociation de la Phase II du PRISE ; la signature de l'Accord de prêt et la mise en place de l'équipe de la gestion du projet (signature de l'arrêté par le ministre de la tutelle en date 14 mars 2023 ; notification du personnel par le secrétaire général en date du 28 mars 2023, recrutement du personnel additionnel) et aux satisfactions des conditions du premier décaissement ;

L'Année 2023 a été caractérisée par le lancement du projet PRISE II du 15 au 16 février 2023, la signature des quatre contrats pour les acquisitions des matériels informatiques et équipements des bureaux pour la Coordination National (DIAR) et la CSPP ; la signature de deux contrats pour la construction des bureaux pour les Régies provinciale de Kasai-Oriental et du Kasai Central ; 35 contrats pour les Travaux de Réhabilitations des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines ainsi que la construction des places à vivre et la fourniture des mobiliers scolaires dans les dix provinces de la zone du projet.

L'Année 2024 a permis la signature des contrats restants pour les infrastructures scolaires, sanitaires, d'assainissement et d'espaces à vivre. 13 contrats ont été signés pour les travaux, 1 contrat pour les services du consultants AEP.

Ramenant ainsi le nombre total des contrats signés à 58, répartis comme suit : 45 contrats des travaux, 10 contrats d'acquisitions des biens et 3 contrats de service des consultants.

III. ACTIVITES REALISEES EN 2025

L'année 2025 a été marquée par la signature des contrats et le démarrage des travaux d'AEP ainsi que par la réception provisoire des certaines autres infrastructures socio-économiques. Ainsi, 6 contrats sur 7 ont été signés pour la réalisation en milieu rural des travaux de 19 mini-réseaux d'AEP sur 22.

Le 7^{ème} Lot de 3 mini-réseaux prévus pour la Province du Lomami qui été infructueux et est à relancer. Il est à signaler que les travaux d'essai des débits des forages sont en cours sur 5 sites au moins dont 3 essais ont été déclarés réussis.


Suivant le Plan de Passation des Marchés (PPM) et le Programme de Travail 2025, il a été prévu pour les activités à réaliser dans cette période, une prévision de **31 837 270,50 USD** soit **22 298 442,69 UC** au taux initial de 1 UC = 1,42778 USD.

Ce montant était réparti par sources de financement comme suit : 25 750 414,32 USD à financer sur le Prêt FAD et 6 446 83 USD sur le fonds de contrepartie du Gouvernement de la RDC

Tableau 3 : répartition des prévisions 2025 par sources de financement

N°	Projets/ Sources de financement	Budget/PTBA 2025 en USD
1	Prêt FAD/BAD	30 405 162,30
2	Contrepartie/ Gouvernement	1 432 108,20
	Total	31 837 270,50


Le graphique : répartition des prévisions 2025 par sources de financement

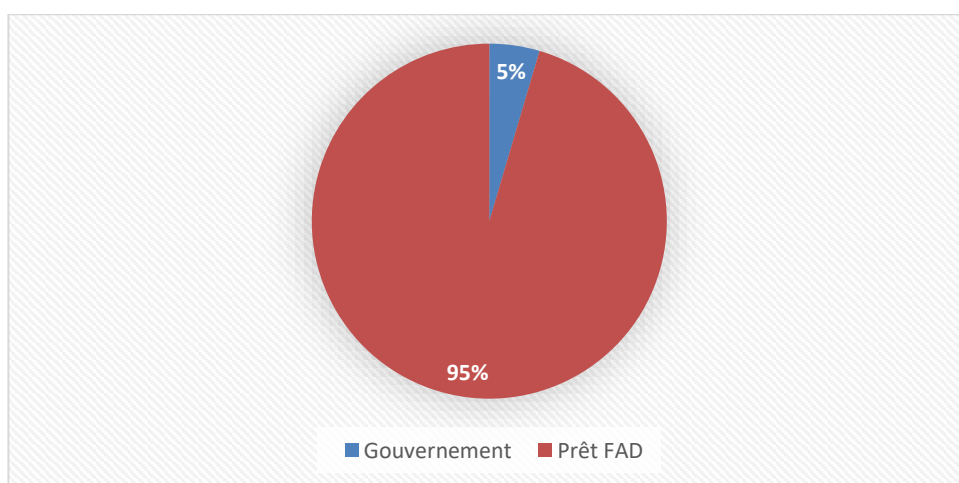

Le Tableau 4 : Répartition des prévisions 2025 par Catégorie

N°	Projets/ Catégories	Prévisions/PTBA 2025 en USD
1	Travaux	22 640 528,59
2	Biens	3 118 077,40
3	Services	3 668 595,52
4	Fonctionnement	2 410 069,00
	Total Coût de base	31 837 270,50
	Total	31 837 270,50

Le graphique : répartition des prévisions 2025 par Catégories

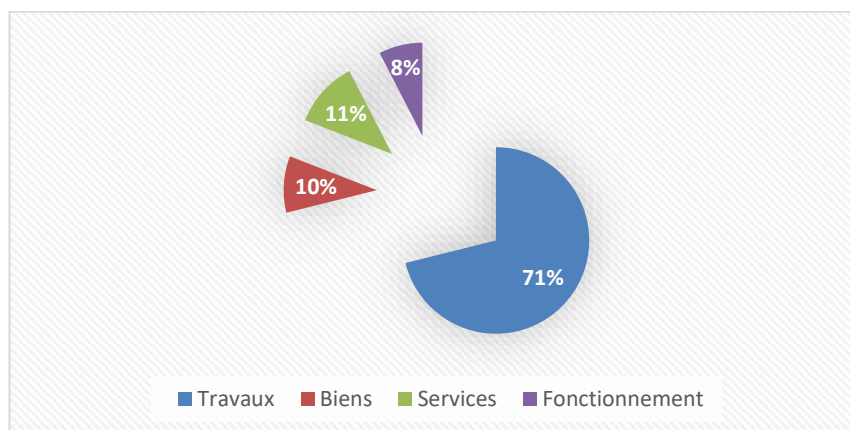

III.1 Détail des exécutions physiques de 2025 suivant les catégories des activités

L'exécution des activités de 2025 par catégorie se présente de la manière suivante :

a) Travaux

Pour les travaux, il était question de poursuivre l'exécution des travaux de construction des infrastructures scolaires, de santé d'assainissement et d'espaces à vivre pour lesquels 35 contrats ont été attribués à la fin de l'année 2024 et attribuer le reste pour atteindre le nombre d'infrastructures retenues.

Les contrats pour la construction de 41 écoles, 40 centres de santé, 40 espaces à vivre, 2 bureaux des régions provinciales de service public d'eau et 88 latrines initialement prévues et revu à 208 et ce sur recommandations de la mission de supervision de la BAD de mai 2025 y compris les latrines associées à chacune des infrastructures à construire par le PRISE II ont été attribués. Il est à signaler que le nombre total des contrats des travaux signés par l'UCP PRISE est de 51.

Les 51 contrats des infrastructures scolaires, sanitaires, d'assainissement, d'espaces à vivre ainsi que les bureaux de deux régions provinciales de service public d'eau et de mini-réseaux d'AEP ont été signés pour un montant total de Dollars 26 185 376,54 USD.

Pour les mini réseaux d'AEP, les contrats ont été signés début janvier 2025 pour 19 sites sur 22 et les travaux ont démarré à partir d'Avril 2025. Le 7^{ème} lot (3 AEP dans la Province de Lomami), déclaré infructueux fera l'objet d'une relance. Les travaux des 19 sites se déroulent dans les 6 Provinces du Kasai Oriental, Sankuru, Maniema, Kasai Central, Kasai, et Kwilu.

A ce jour les travaux se déroulent normalement et ont atteint en ce qui concerne les infrastructures scolaires, sanitaires, d'assainissement et les espaces à vivre un taux moyen d'environ 75 %, tandis les travaux de construction de deux bureaux des régions provinciales du Kasai Central et Oriental ont un taux respectif de 100% et 50 %.

Le Tableau 5 : Réalisations Physiques des infrastructures Projet PRISE II en 2025

N°	Activités/travaux	Prévisions totales PRISE (Nombres prévus)	Réalisation au 31 / 12 /2025		
			Réalisé	En cours de réalisation	Taux réalisation Physique (%)
	TRAVAUX				
1	Espaces à vivre	40	28	12	70%
2	Bâtiments scolaires	41	28	13	68%
3	Centres de santé	40	26	14	65%

N°	Activités/travaux	Prévisions totales PRISE (Nombres prévus)	Réalisation au 31 / 12 /2025		
			Réalisé	En cours de réalisation	Taux réalisation Physique (%)
4	Latrines Publiques	208	135	73	65%
5	Mini réseaux d'AEP en milieu rural	22	-	19	20%
6	Bureaux provinciaux des Régies de service public d'eau potable	2	1	1	50%

b) Biens

En ce qui concerne les biens de la composante A, le programme prévoyait l'acquisition de matériels médicaux et de stock de médicaments essentiels pour le bon fonctionnement des centres de santé, des équipements et matériels complémentaires pour le Centre Multifonctionnel Genre de Mbujimayi et l'acquisition des mobiliers scolaires.

Les mobiliers scolaires ont été commandés au travers les contrats de travaux d'écoles pour permettre à ce que la fin des travaux coïncide directement avec la remise des mobiliers. Chaque école recevra 150 bancs pupitres, 6 tables, armoires et 6 chaises.

La livraison des matériels médicaux et des médicaments essentiels a démarré au troisième trimestre 2025 et se poursuit. A ce jour plus de 22 centres de santé ont été équipés. En ce qui concerne les équipements pour les maternités choisies par le Secrétariat Général de la Santé Publique, le contrat a été signé et la livraison des équipements est prévue pour début 2026.

Pour ce qui est de 3000 foyers améliorés le projet a déjà procédé à la signature du contrat avec le fournisseur et nous attendons la livraison

Quant au marché d'Acquisition des équipements techniques de terrain et de recherche hydrologique pour la direction des ressources en eau, le Projet attend l'avis de non-objection du projet de contrat pour la poursuite du processus

Dans la catégorie B, d'étude et renforcement des capacités, les contrats des différents biens prévus ont été signés et certains fournis et d'autres en attente d'être fournis. Pour les biens qui ont été fournis, il s'agit de :

- Matériels informatiques pour la Coordination de l'UCP PRISE II ;
- Matériels informatiques pour la CSPP/Finances ;
- Mobiliers et équipements de bureau pour l' UCP PRISE II ;
- Mobiliers et équipements de bureau pour la CSPP/FINANCES ;
- Mobiliers et équipements pour les régies provinciales du Kasai Central et du Kasai-Oriental ;
- Matériels informatiques pour les régies provinciales du Kasai Central et du Kasai Oriental.

S'agissant des marchés d'acquisition des matériels roulants il a été relevé ce qui suit :

-Le lot 01 et le Lot 03 relatifs à l'acquisition de Deux (2) véhicules 4x4 station wagon

Direction/ coordination du Projet/DIAR ainsi que l'acquisition d'Un Minibus de 16 places pour la CSPP/Ministère des Finances à livrer à Kinshasa ont été résilié pour non-exécution et dépassement de taux de pénalité au-delà de 10% ;

- Le Lot 02 est en cours de livraison dont l'achèvement est projeté au 28/02/2026 ;

- Les Trente-six (36) Motos Monocylindre 2 temps dont 13 livrés à Kananga pour l'axe d'intervention et la Brigade d'Assainissement, 13 livrés à Mbujimayi pour l'axe d'intervention et la Brigade d'Assainissement respective, 4 livrées à Tshikapa, 4 livrés à Bandundu Ville pour leur Brigade

d'Assainissement et 2 livrées à Kabinda pour la Brigade d'Assainissement et 8 (huit) motos pour les différents axes d'interventions projet/DIAR relatifs au Lot 03 ont été livrés à 100%.

c) Services

Dans la catégorie service, 6 contrats ont été signés, il s'agit de contrat de :

- Assistance Technique au Renforcement de Capacités du Personnel de Gestion Financière du Projet PRISE II en vue de la Migration Informatique du Système Comptable en Conformité avec le SYCEBNL et la Sécurisation ainsi que la Sauvegarde des Bases de Données Comptables ;
- Assistance Technique au Renforcement de Capacités du Personnel de Gestion Financière des Projets en vue du Basculement sur le Système Comptable des Entités à But non Lucratif (SYCEBNL) ;
- Services de Consultant Individuel chargé de l'audit indépendant des acquisitions passées
- suivant le système national exercices 2023 et 2024 ;
- Services de consultant/Firme chargé de contrôle et de surveillance des travaux de forage et mini-réseaux d'AEP dans les provinces du Kasai-Oriental, Lomami, Sankuru et Maniema ;
- Services de consultant/Firme chargé de contrôle et surveillance des travaux de forage et mini-réseaux dans les provinces du Kasai central, du Kasai et du Kwilu.

Quatre contrats ont été exécutés à 100 % à savoir : les Services du consultant de courte durée chargé d'actualisation du manuel des procédures administratives, comptables et financières et formation comptables ; les Services Consultant Individuel Expert en Gestion Environnementale et Sociale ; les Services d' Assistance Technique au Renforcement de Capacités du Personnel de Gestion Financière du Projet PRISE II en vue de la Migration Informatique du Système Comptable en Conformité avec le SYCEBNL et la Sécurisation ainsi que la Sauvegarde des Bases de Données Comptables ainsi que les services d'Assistance Technique au Renforcement de Capacités du Personnel de Gestion Financière des Projets en vue du Basculement sur le Système Comptable des Entités à But non Lucratif (SYCEBNL).

d) Fonctionnement

Un montant de 1 771 891,52 USD a été alloué au fonctionnement et la gestion courante de l'UCP PRISE II notamment sur les missions de terrain, les indemnités du personnel, les frais de carburant, les différents entretiens des véhicules, la communication et les frais de mission de terrain.

IV. SITUATION DES REALISATIONS FINANCIERES DU PRISE II 31 DECEMBRE 2025

Tableau N°6 : Détail des réalisations au 31 décembre 2025.

N°	Activités	Budget en USD au taux de 1 UC = 1,36 USD	Engagement Total au 31/12/2025 en USD	Décaissements 2023 en USD	Décaissements 2024 en USD	Décaissements 2025 en USD	Total décaissements au 31 décembre 2025 en USD	Taux de décaissement sur les marchés	Taux des exécutions Physiques des marchés (6)
		('1)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)= ('3+4+5)	('7)= ('6)/('2)	
	Composante A. DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES								
	Catégorie Biens								
1	Acquisition des mobiliers scolaires	737 602,80	665 854,82	-	230 523,63	332 275,50	562 799,13	84,5%	70%
2	Acquisition des équipements médicaux	2 159 787,44	1 867 594,92	-	-	1680835,43	1 680 835,43	90,0%	70%
	Sous total /catégorie Biens	2 897 390,24	2 533 449,74	0,00	230 523,63	2 013 110,93	2 243 634,56	88,6%	-
	Catégorie travaux								
1	Construction des mini-réseaux d'AEP en milieu rural	16 334 050,16	18 035 548,31	-	-	7 653 590,39	7 653 590,39	42,4%	18%
2	Construction des Bureaux pour les régies provinciales	380 746,96	438 542,57	-	195 985,81	110 708,05	306 693,86	69,9%	75%
3	Réhabilitation et Construction des Ecoles primaires ; des Centres de Santé ; des latrines et la construction des Espaces à vivre.	24 265 390,64	26 027 223,66	3 561 878,09	13 413 498,15	5 046 793,97	22 022 170,21	85,0%	80%
	Sous total /catégorie Travaux	40 980 187,76	44 501 314,54	3 561 878,09	13 609 483,96	12 811 092,41	29 982 454,46	67,0%	-
	Catégorie service								
1	Contrôle et surveillance des travaux de construction des écoles, centres de santé,	571 121,12	-	-	-	-	-	-	-

N°	Activités	Budget en USD au taux de 1 UC = 1,36 USD	Engagement Total au 31/12/2025 en USD	Décaissements 2023 en USD	Décaissements 2024 en USD	Décaissements 2025 en USD	Total décaissements au 31 décembre 2025 en USD	Taux de décaissement sur les marchés	Taux des exécutions Physiques des marchés (6)
		('1)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)= ('3+4+5)	('7)= ('6)/('2)	
	latrines publiques et espaces à vivre								
2	Contrôle et surveillance des travaux AEP Rural	2 379 669,52	2 699 068,50	-	-	-	-	-	6%
3	Campagne d'IEC	1 041 292,16	-	-	-	-	-	-	-
	Sous total/Catégorie service	3 992 082,80	2 699 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Sous Total coût de base de la Composante A	47 869 660,80	49 733 832,78	3 561 878,09	13 840 007,59	14 824 203,34	32 226 089,02	65,0%	-
	Composante B. ETUDES ET RENFORCEMENT DES CAPACITES					-			
	Catégorie Biens					-			
1	Matériel roulant	698 671,44	703 460,00	-	70 346,00	452 964,00	523 310,00	74,4%	50%
2	Mobilier de bureaux	80 399,12	81 520,00	-	81 520,00	-	81 520,00	100,0%	100%
3	Matériels Informatiques	48 640,40	53 940,00	-	53 940,00	-	53 940,00	100,0%	100%
4	Equipements Divers	352 191,04	304 569,76	-	-	-	-	0%	0%
	Sous total /catégorie Biens	1 179 902,00	1 143 489,76	0,00	205 806,00	452 964,00	658 770,00	-	
	Catégorie service					-			
1	Renforcement des capacités des acteurs	1 760 540,40	0	-	-	-	-	-	0%
2	Etudes et assistance aux réformes du secteur AEPA	7 953 890,64	-	-	-	-	-	-	0%
	sous total/Catégorie service	9 714 431,04	-	-	-	-	-	-	
	Sous Total coût de base de la Composante B	10 894 333,04	1 143 489,76	0,00	205 806,00	452 964,00	658 770,00	58%	
	Composante C. COORDINATION ET GESTION DE PROJET.					-			
	Catégorie service					-			

N°	Activités	Budget en USD au taux de 1 UC = 1,36 USD	Engagement Total au 31/12/2025 en USD	Décaissements 2023 en USD	Décaissements 2024 en USD	Décaissements 2025 en USD	Total décaissements au 31 décembre 2025 en USD	Taux de décaissement sur les marchés	Taux des exécutions Physiques des marchés (6)
		('1)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)= ('3+4+5)	('7)= ('6)/('2)	
1	Honoraires Consultants ponctuels du projet	451 185,44	313 700,00	-	52 486,00	92 548,40	145 034,40	46%	65%
2	Audit des comptes, Acquisitions et Manuels	2 818 054,64	181 914,98	-	136 622,57	81 723,17	218 345,74	120%	75%
	Sous total/Catégorie service	3 269 240,08	495 614,98	0,00	189 108,57	174 271,57	363 380,14	73%	
	Catégorie Fonctionnement					-			
1	Fonctionnement du PRISE	6 918 766,08	4 520 811,05	1 096 224,09	1 652 695,44	1 771 891,52	4 520 811,05	100%	100%
	Sous total fonctionnement	6 918 766,08	4 520 811,05	1 096 224,09	1 652 695,44	1 771 891,52	4 520 811,05	100%	
	Sous Total composante C	10 188 006,16	5 016 426,03	1 096 224,09	1 841 804,01	1 946 163,09	4 884 191,19	97%	
	Total de base	68 952 000,00	55 893 748,57	4 658 102,18	15 887 617,60	17 223 330,43	37 769 050,21	68%	
	Imprévus physiques	4 826 640,00	-	-	-	-	-	-	
	Hausse de prix	2 068 560,00	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL GENERAL	75 847 200,00	55 893 748,57	4 658 102,18	15 887 617,60	17 223 330,43	37 769 050,21	68%	77%

L'exécution financière en dollars du PRISE II est 55,12% du budget global et de 54,10% du PTBA 2025. Pour une prévision budgétaire annuelle de 31 837 270,50 USD, dont 17 223 330,43 USD ont été décaissés pour l'année 2025 ramenant ainsi le décaissement total cumulé à 38 007 927,64 USD.

Sachant que 7 720 720,00 USD équivalent à 10% du coût Globale du budget correspondant à la Contrepartie du Gouvernement, rien n'a été mobilisé.

De ce qui précède, le taux de décaissement par rapport au budget global uniquement sur le PRET FAD équivalent à 38 007 927,64 USD est de 55,89%.

Tableau 7 : Taux d'exécution financière au 31 décembre 2025 par composante

N°	Projets/ Composantes	Financement		Engagement	Réalizations PRISE II au 31/12/2025				Taux	
		Budget Global en USD	Budget/PTBA 2025 en USD	Niveau d'engagement global au 31/12/2025 en USD	Réalizations PRISE II 2023 en USD	Réalizations du 01/01 au 31/12/2024 en USD	Réalizations du 01/01 au 31/12/2025 en USD	Cumul des réalisations au 31/12/2025 en USD	Taux de réalisation PTBA 2025 en %	Taux de décaissement par rapport au budget global en %
		('1)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)= « 4)+('5)+('6)	('8)= ('7)/('2)	('9)= ('7)/('1)
1	Infrastructures d'AEPA, sanitaires et scolaires	47 869 660,80	26 888 465,30	49 733 832,78	3 561 878,09	13 840 007,59	14 824 203,34	32 226 089,02	55,13%	67%
2	Etudes et renforcement des capacités	10 894 333,04	2 429 222,20	1 143 489,76	39 500,00	594 292,00	452 964,00	1 086 756,00	44,74%	10%
3	Coordination et gestion du projet	10 188 006,16	2 519 583,00	5 016 426,03	1 096 224,09	1 652 695,44	1 946 163,09	4 695 082,62	77,24%	46%
	Coût de base	68 952 000,00	31 837 270,50	55 893 748,57	4 697 602,18	16 086 995,03	17 223 330,43	38 007 927,64	54,10%	55,12%

N°	Projets/ Composantes	Financement		Engagement	Réalizations PRISE II au 31/12/2025				Taux	
		Budget Global en USD	Budget/PTBA 2025 en USD	Niveau d'engagement global au 31/12/2025 en USD	Réalizations PRISE II 2023 en USD	Réalizations du 01/01 au 31/12/2024 en USD	Réalizations du 01/01 au 31/12/2025 en USD	Cumul des réalisations au 31/12/2025 en USD	Taux de réalisation PTBA 2025 en %	Taux de décaissement par rapport au budget global en %
		(‘1)	(‘2)	(‘3)	(‘4)	(‘5)	(‘6)	(‘7)= (« 4)+(‘5)+(6)	(‘8)= (‘7)/(‘2)	(‘9)= (‘7)/(‘1)
4	Imprévus physiques	4 826 640,00	-	-	-	-		-	0,00%	0,00%
5	Inflations sur les prévisions	2 068 560,00	-	-	-	-		-	0,00%	0,00%
	Total	75 847 200,00	31 837 270,50	55 893 748,57	4 697 602,18	16 086 995,03	17 223 330,43	38 007 927,64	54,10%	50,11%
	Total part Gouvernement	7 720 720,00	1 432 108,20	0	0	0	0	0	0%	0%
	Total part PRET FAD	68 000 000,00	30 405 162,30	55 893 748,57	4 697 602,18	16 086 995,03	17 223 330,43	38 007 927,64	56,6%	55,89%

Tableau 8 : Taux d'exécution financière au 31 décembre 2025 par catégorie

N°	Projets/ Catégories	Financement		Engagement	Réalizations PRISE II au 31/12/2025				Taux	
		Budget Global en USD	Budget/PTBA 2025 en USD	Niveau d'engagement global au 31/12/2025 en USD	Réalizations PRISE II 2023 en USD	Réalizations du 01/01 au 31/12/2024 en USD	Réalizations du 01/01 au 31/12/2025 en USD	Cumul des réalisations au 31/12/2025 en USD	Taux de réalisation Fin du PTBA 2025 en %	Taux de décaissement par rapport au budget global en %
		('1)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)=('4)+('5)+('6)	('8)=('6)/('2)	('9)= ('7)/('1)
1	Travaux	40 980 187,76	22 640 528,59	44 399 437,49	3 561 878,09	14 173 907,59	12 372 556,12	30 108 341,80	54,65%	73,47%
2	Biens	4 077 292,24	3 118 077,40	3 626 021,94	0	207 906,00	2 866 310,09	3 074 216,09	91,93%	75,40%
3	Services	16 975 753,92	3 668 595,52	3 105 268,48	39 500,00	52 486,00	212 572,70	304 558,70	5,79%	1,79%
4	Fonctionnement	6 918 766,08	2 410 069,00	4 520 811,05	1 096 224,09	1 652 695,44	1 771 891,52	4 520 811,05	73,52%	65,34%
	Coût de base	68 952 000,00	31 837 270,51	55 651 538,96	4 697 602,18	16 086 995,03	17 223 330,43	38 007 927,64	54,10%	55,12%
5	Imprévus physiques	4 826 640,00	-		-	0		0	0,00%	0,00%
6	Hausse de prix	2 068 560,00	-	-	-	0		0	0,00%	0,00%
	Total	75 847 200,00	31 837 270,51	55 651 538,96	4 697 602,18	16 086 995,03	17 223 330,43	38 007 927,64	54,10%	50,11%
	Total part GOUVERNEMENT	7 720 720,00	1 432 108,20	0	0	0	0	0	0	0

N°	Projets/ Catégories	Financement		Engagement	Réalizations PRISE II au 31/12/2025				Taux	
		Budget Global en USD	Budget/PTBA 2025 en USD	Niveau d'engagement global au 31/12/2025 en USD	Réalizations PRISE II 2023 en USD	Réalizations du 01/01 au 31/12/2024 en USD	Réalizations du 01/01 au 31/12/2025 en USD	Cumul des réalisations au 31/12/2025 en USD	Taux de réalisation Fin du PTBA 2025 en %	Taux de décaissement par rapport au budget global en %
		('1)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)=('4)+('5)+('6)	('8)=('6)/('2)	('9)= ('7)/('1)
	Total part PRET FAD	68 000 000,00	30 405 162,30	55 651 538,96	4 697 602,18	16 086 995,03	17 223 330,43	38 007 927,64	55,6%	55,89%

Tableau 9 : Taux de l'exécution financière au 31 décembre 2025 par source de financement

N°	Projets/ Source de financement	Financement		Engagement	Réalizations PRISE II au 31/12/2025				Taux	
		Budget Global en USD	Budget/PTBA 2025 en USD	Niveau d'engagement global au 31/12/2025 en USD	Réalizations PRISE II 2023 en USD	Réalizations du 01/01 au 31/12/2024 en USD	Réalizations du 01/01 au 31/12/2025 en USD	Cumul des réalisations au 31/12/2025 en USD	Taux de réalisation Fin. du PTBA 2025 en %	Taux de décaissement au budget global en %
		('1)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7) = ('4)+('5)+('6)	('8) = ('6)/('2)	('9) = ('7)/('1)
1	Contrepartie du Gouvernement	7 847 200,00	1 432 108,20	0,00	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Prêt FAD/BAD	68 000 000,00	30 405 162,30	55 651 538,96	4 697 602,18	16 086 995,03	17 223 330,43	38 007 927,64	56,65%	55,89%
	Coût de base	75 847 200,00	31 837 270,50	55 651 538,96	4 697 602,18	16 086 995,03	17 223 330,43	38 007 927,64	54,10%	50,11%

V. ASPECTS TRANSVERSAUX

V.1. SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

V.1.1. Cadre de sauvegarde environnementale et sociale

Le projet PRISE II est classé en Catégorie 2 au regard des exigences environnementales et sociales (E&S), impliquant des impacts potentiels localisés, spécifiques aux sites et maîtrisables à travers des mesures d'atténuation appropriées.

Un dispositif complet de gestion E&S a été élaboré et opérationnalisé conformément à la législation nationale congolaise et aux standards opérationnels de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Les principaux instruments de sauvegarde comprennent :

- 30 Études d'Impact Environnemental et Social (EIES) assorties de Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), validées par l'ACE (certificat environnemental délivré le 09 octobre 2021) et publiées par la BAD (02 novembre 2021).
- PGES-C (Plans de Gestion Environnementale et Sociale de Chantier) obligatoires pour chaque entreprise contractante.
- Matrice de Suivi Environnemental et Social (MSES) pour la consolidation des données de suivi.
- Rapports Mensuels de Mise en Œuvre Environnementale (RMMOE).
- Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) avec 17 Comités de Gestion des Plaintes (8 Pool-Est, 9 Pool-Ouest) et mise en place d'un numéro vert.
- Dispositifs spécifiques liés aux VBG et EAS/HS, intégrés dans les PGES-C avec codes de conduite et formations obligatoires.

Ce cadre constitue l'ossature opérationnelle de conformité et conditionne le démarrage légal des travaux.

V.1.2. Niveau d'avancement des mesures E&S (T4 – 2025)

V.1.2.1. Documentation et conformité administrative

- 51 PGES-C validés (100 % des contrats actifs).
- Tous les contrats intègrent des obligations E&S formelles.
- 27 certificats environnementaux délivrés.

La validation préalable des PGES-C est systématiquement exigée avant mobilisation des entreprises.

V.1.2.2. Performance environnementale et sociale des Entreprises contractantes

Sur les 51 contrats en cours d'exécution dans le Pool-Est et Pool-Ouest :

- 47 Contrats soit 92% ont des performances satisfaisantes et
- 4 Contrats soit 8% ont des performances peu satisfaisantes qui nécessitent l'amélioration.

Dans l'ensemble, les entreprises affichent une performance environnementale et sociale globalement satisfaisante, avec un taux d'appréciation estimé à 81 %. Ces résultats traduisent une appropriation progressive des exigences environnementales et sociales du projet. Néanmoins, certaines entreprises requièrent un encadrement technique et un suivi renforcé pour que les Non-conformités mineures relevées, soient corrigées (EPI, gestion des déchets, stockage de matériaux, etc). À cet effet, des mesures correctives ciblées et graduelles seront mises en œuvre, dans une logique d'amélioration continue de la performance et de maîtrise durable des risques environnementaux et sociaux.

V.1.1.3. Gestion des plaintes

- 17 comités opérationnels.
- 18 plaintes enregistrées au total, dont 6 traitées au T4/2025 (principalement liées à la rotation de la main-d'œuvre).
- Aucune plainte majeure susceptible d'affecter la viabilité du projet.
- Processus de vulgarisation du numéro vert en cours (déploiement prévu T1 2026).
- Le mécanisme fonctionne de manière structurée, avec traçabilité des dossiers.

V.1.1.4. Sensibilisation et prévention des risques

- 118 sessions de sensibilisation réalisées sur les chantiers.
- Thématiques : sécurité au travail, EPI, hygiène, prévention VBG/VIH, gestion des déchets, bonnes pratiques environnementales.
- Participation communautaire et implication des autorités coutumières encouragées.
- La campagne d'IEC à grande échelle reste en attente de l'ANO de la BAD.

V.1.1.5. Emplois créés

Dans le volet social, le respect des exigences sociales a été mis en exergue en exhortant les entreprises à payer leurs personnels et mettre à leurs dispositions un traitement équitable. Les populations des différents sites se sont appropriés les réalisations du Projet PRISE II et en font un témoignage positif. Il y a eu création d'emplois du fait de l'utilisation de la main d'œuvre, environ 2019 personnes dont 1877 hommes et 144 femmes sont employés pour l'exécution des travaux, sans compter les fournisseurs des biens ou services et matériels locaux.

V.1.1.6. Supervision et coordination

- 13 missions de supervision E&S réalisées au T4/2025 ;
- Présence d'un environnementaliste dans chaque entreprise ;
- Coordination assurée par la CEP ;
- Consolidation régulière des données et rétroaction aux acteurs terrain.

V.1.3. Mise en œuvre des recommandations de la BAD (Mission nov. 2025)

L'état d'exécution des recommandations est globalement satisfaisant :

- Étude complémentaire E&S : Réalisation en continue sur les sites nécessitant une évaluation sommaire d'aménagement des sources d'eau (cas de Luekeshi) ;
- Gestion des plaintes : mise en œuvre effective (installation des CGP et reporting) ;
- Audit E&S 2023–2025 : procédure de contractualisation en cours (attente ANO) ;
- Sensibilisation (Campagnes IEC) : processus en cours de recrutement ;
- PTBA 2026 : la sauvegarde Environnementale et sociale est prise en compte dans la planification des activités du projet.
- Conditions de travail : conformité contractuelle vérifiée (contrats formalisés, sensibilisation au respect du SMIG en vigueur).

V.1.4. Indicateurs clés de performance (ICP – T4/2025)

Thème	Indicateur	Valeur
PGES-C validés	Nombre total	51
Incidents majeurs	Cas	0
Plaintes enregistrées	Nombre	18
Comités de plaintes	Nombre	17
Sessions de sensibilisation	Nombre de session	118
Missions de supervision	Nombre	13
Entreprise performant	Nombre	47

V.1.5. Appréciation globale de conformité

À l'issue du quatrième trimestre 2025 :

- Les obligations E&S prévues dans la convention de financement sont globalement respectées.
- Les outils de gestion sont opérationnels sur l'ensemble des sites actifs.
- Les risques environnementaux et sociaux sont maîtrisés.

Le système de sauvegarde environnementale et sociale du PRISE II est pleinement opérationnel et structuré autour d'instruments réglementaires validés, d'un dispositif de suivi consolidé et d'un mécanisme de gestion des plaintes fonctionnel.

La performance E&S global du Projet, estimée à 85 %, traduit un niveau de conformité satisfaisant au regard des exigences nationales et des standards de la BAD.

V.2. GENRE :

En ce qui concerne les aspects genre, certaines activités ont été réalisées dans les chantiers des travaux, 18 sites ont été concernés par ces activités, le nombre total des participants est de 532 dont 499 hommes et 33 femmes.

- **Sensibilisation** : les thèmes principaux concernés par cette sensibilisation étaient les IST, violence basée sur le genre, les maladies contagieuses, le lavage des mains ainsi que les attitudes entre ouvriers et personnes féminins sur site et en communauté.
- **Plan Genre** : dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Genre, une activité a été organisée en Mbuji-Mayi «la Foire de l'entrepreneuriat genre », qui a regroupé 125 structures exerçant les Activités Génératrices de Revenu (AGR). Enfin un voyage d'échanges d'expériences, pour les bénéficiaires du CMG, a été organisé à l'intérieur du Pays avec 7 participants dont 2 hommes et 5 femmes.

VI. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET LES EVENEMENTS SAILLANTS AU COURS DE L'ANNEE 2025 .

Pendant l'année 2025, le Projet a connu les missions, réunions de suivi des activités et des événements saillants dont les principaux sont repris ci-après :

Tableau 10 : Activités de suivi de la mise en œuvre du PRISE et événements saillants de l'année 2025

Mission	Période
Mission de supervision du PRISE II par la BAD conduite par le Responsable Pays a.i	Du 5 au 19 Mai 2025
Visite des activités du PRISE dans la province du Kwilu, Kwango et Kasai par SE. M. le Ministre d'Etat, Ministre du Développement Rural	Du 22 au 25 septembre 2025
Mission de supervision à mi-parcours du PRISE	Du 03 au 17 Novembre 2025
Audit de la Cour de comptes	Du 17 au 23 mars 2025 et du 02 au 15 mai 2025
Mission du CPCC sur la migration des comptes PRISE au niveau référentiel SYCEBNL	Du 10 mars au 09 avril 2025
Audit des acquisitions	Du 23 novembre au 24 décembre 2025

VII. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS ENVISAGEES

VII.1. DIFFICULTES

Au cours de l'exécution du Projet, depuis la signature des accords de financement, les difficultés suivantes ont été relevées :

- Mauvais état des routes qui mènent vers les sites des travaux ; ce qui rend l'accessibilité difficile pour le suivi des travaux et l'approvisionnement en matériaux et matériels.
- L'insécurité dans une partie de la zone d'intervention du projet PRISE II avec le phénomène Mobondo dans la province de Kwango et Mai-Ndombe (une partie de l'ex Province de Bandundu).
- Retard dans les ANO de la BAD ;
- Non-respect des délais contenus dans les chronogrammes des travaux, par certaines entreprises.
- Démarrage des travaux de mini réseaux d'AEP avant le recrutement de la mission de contrôle.

VIII.2. SOLUTIONS

- Délocalisation de site des travaux de la zone d'insécurité vers la zone sécurisée ;
- Transmission régulière des instances des ANO a la CSPP/Finances ;
- Des recommandations sont régulièrement formulées par le projet aux entreprises par écrit et/ou par des réunions en présentiel en vue du respect des chronogrammes des travaux ;
- Les DPO et/ou fonctionnaires du Secrétariat General du Développement Rural ont été utilisés dans le suivi des travaux d'infrastructure ;

Suivi régulier sur terrain des travaux AEP par les Experts du Projet PRISE en attendant le déploiement de la mission de contrôle

ANNEXES

ANNEXE : CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DE PRISE II

Tâche/Activités	A	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027			
	T	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
DATES CLES DU PROJET																													
Processus d'approbation du Prêt FAD : Déc. 2021																													
Signature de l'Accord de Prêt : Fév. 2022																													
Date d'entrée en vigueur : Avril 2022																													
Date d'achèvement du projet : Décembre 2026																													
Date du dernier décaissement : Avril 2027																													
MISE EN ŒUVRE DU PROJET																													
COMPOSANTES A : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES																													
1.CATEGORIES DES TRAVAUX																													
Réhabilitation des 41 Bâtiments scolaires avec équipement en mobiliers, 40 Centres de santé, 40 Espaces à vivres et Aménagement de 88 latrines Publiques dans les Provinces du projet	P																												
	R																												
Construction des bureaux de la Régie Provinciale du service publique de l'eau à Mbuji-Mayi et Kananga	P																												
	R																												
Travaux de réalisation de 22 Mini réseaux d'AEP en Milieu rural avec Énergie solaire et thermique pour le pompage d'eau dans les provinces du projet	P																												
	R																												
2.CATEGORIES DES BIENS																													
Acquisition d'équipement médicaux pour les centres de santé	P																												
	R																												
3.CATEGORIES DES SERVICES																													
Contrôle & Surveillance des travaux AEP en milieu rural	P																												
	R																												
Campagne d'IEC (Hygiène, l'Eau, Santé, Genre, Assainissement et Pérennisation des Infrastructures réalisées)	P																												
	R																												
COMPOSANTES B : ETUDES ET RENFORCEMENT DES CAPACITES																													
1. CATEGORIES BIENS																													
Acquisitions de matériels roulants, mobiliers de bureaux et matériels informatiques	P																												
	R																												
Equipements de 10 maternités des régions ciblées, Distribution de 10 000 foyers améliorés	P																												
	R																												
2.CATEGORIES DES SERVICES																													

[illegible]
