



MINISTÈRE
DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Projet "PRISE"
PROJET P-CD-E00-006



AFRICAN DEVELOPMENT
BANK GROUP

Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-Economiques
dans la Region du Centre de la RDC
Projet "PRISE II"

RAPPORT DU PREMIER TRIMESTRE 2026 DES ACTIVITES



JUILLET 2026

TABLE DES MATIERES	1
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES	3
PREAMBULE	5
PRESENTATION DU PROJET PRISE II	7
I.1. APERÇU GÉNÉRAL	7
I.2. DONNÉES DE BASE DU PROJET	7
I.3. ZONE D'INTERVENTION DU PROJET	8
I.4. DESCRIPTION DU PROJET	9
I.5. DÉTAILS DES COÛTS DU PRISE PAR ACTIVITÉ DES RESSOURCES DU PROJET.	13
RAPPEL DES ACTIVITES DU PRISE II AU 31/12/2024	17
II.1. LOCALISATION DES ACTIVITÉS DU PRISE II DANS LE POOL OUEST	17
II.2. LOCALISATION DES ACTIVITÉS DU PRISE II DANS LE POOL EST	19
ACTIVITES REALISEES EN 2025	24
III.1. DETAIL DES EXECUTIONS PHYSIQUES DE 2025 SUIVANT LES CATÉGORIES DES ACTIVITÉS	25
EXECUTION DU PROGRAMME D'ACTIVITES ET BUDGET ANNUEL 2026	28
IV.1. PROGRAMME DES ACTIVITES POUR 2026	28
IV.2. BUDGET ANNUEL 2026	28
IV.3. DETAIL DES EXECUTIONS PHYSIQUES AU PREMIER TRIMESTRE 2026 PAR CATÉGORIE D'ACTIVITÉS	31
IV.4. ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS DANS LE POOL OUEST	33
IV.5. ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES DANS LE POOL EST	39
IV.6. ACHEVEMENT DES OUVRAGES DE 2025 A 2026	45
IV.7. REALISATION PHYSIQUE ET FINANCIERE DES TRAVAUX LEGERS EN COURS AU 31 MARS 2026	46
IV.8. EQUIPEMENT DES OUVRAGES	47
IV.9. TRAVAUX DES SYSTEMES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE	48
IV.10. REALISATIONS FINANCIERES DU PRISE II AU 31 MARS 2026	59
ASPECTS TRANSVERSAUX	72
V.1. SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE	72
SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE ET DES INDICATEURS DU PROJET AU T1-2026	76
VI.1. SUIVI DES INDICATEURS	76
DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS ENVISAGEES	78

VII.1. DIFFICULTES _____ 78

VII.2. SOLUTIONS _____ 78

SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS AU PREMIER TRIMETRE 2026 _____ 79

ANNEXE : CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DE PRISE II _____ 80

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES

ACE	:	Agence Congolaise de l'Environnement
ACF	:	Appel à Consultation des Fournisseurs
AEP	:	Alimentation en Eau Potable
AEPA	:	Alimentation en Eau Potable et Assainissement
AMI	:	Avis à Manifestation d'Intérêt
ANO	:	Avis de Non Objection
AO	:	Appel d'Offres
AOI	:	Appel d'Offres International
AON	:	Appel d'Offres National
APD	:	Avant-Projet Détaillé
APS	:	Avant-Propos Sommaire
ASUREP	:	Association des Usagers de l'Eau Potable
AT	:	Assistance Technique
BAD	:	Banque Africaine de Développement
CDFO	:	Congo Democratic Field Office
CEP –O	:	Cellule d'Exécution des Projets Eau de la REGIDESO
CFEN	:	Consultation de Fournisseurs à l'Echelon National
CI	:	Consultation Individuelle
CM	:	Commission des marchés
CMFG / CMG	:	Centre Multifonctionnel Genre
CN	:	Coordination Nationale
DAC	:	Dossier d'Appel à Consultation
DAO	:	Dossier d'Appel d'Offres
DAOI	:	Dossier d'Appel d'Offres International
DAON	:	Dossier d'appel d'offres national
DNO	:	Demande de l'avis de Non Objection
DP	:	Demande de Proposition
DPD	:	Demande de Paiement Direct
DRF	:	Demande de Reconstitution des Fonds
DSCRIP	:	Document de Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
EAPA	:	Expert en Alimentation en Eau Potable et Assainissement
EIES	:	Etude d'Impact Environnemental et Social
EP	:	Ecole Primaire
EV	:	Espace à Vivres
FAD	:	Fonds Africain de Développement
FEF	:	Facilités en faveur des Etats Fragiles
FIEK	:	Forum International sur l'Eau à Kinshasa
GEFAE	:	Genre Famille et Enfant
HIMO	:	Haut Intensité de Main d'œuvre
IEC	:	Information Education Communication
KFW	:	Kreditanstalt Für Wiederaufbau (Coopération Financière Allemande)
KKC	:	Kasaï, Kasaï Central

KORLS	:	Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru
KOC /KOCC	:	Kasaï Occidental
KOR	:	Kasaï Oriental
LAE	:	Lutte Anti Erosive
LBS	:	Liste des Biens et Services
LR	:	Liste Restreinte
LT	:	Latrine Publique
MECNT	:	Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
MIN-ENER	:	Ministère de l'Energie
MI	:	Manifestation d'Intérêt
MDC	:	Mission de Contrôle
OHADA	:	Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
OMD	:	Objectifs du Millénaire pour le Développement
OVD	:	Office de Voirie et Drainage
PAESU	:	Projet d'Appui en Approvisionnement de l'Eau dans le milieu Semi Rural
PGES	:	Plan de Gestion Environnemental et Social
PM	:	Passation des Marchés
PPM	:	Plan de Passation des Marchés
PNA / DAS	:	Programme National d'Assainissement / Direction d'Assainissement du MECNT
PRISE	:	Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-Economiques dans la Région Centre de la RDC
PTBA	:	Programme de Travail et Budget Annuel
PTF	:	Partenaire Technique et Financier
RDC	:	République Démocratique du Congo
REGIDESO	:	Régie de Distribution d'Eau (de la RD Congo)
RWSSI	:	Rural Water Supply and Sanitation Initiative
SBQC	:	Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
SED	:	Selection par Entente Direct
ST	:	Spécifications Techniques
TDR	:	Termes de Référence
UC	:	Unité de compte (du Groupe de la Banque Africaine de Développement)
UEP	:	Unité d'Exécution du Projet
USD	:	United States Dollar (Dollar American)

Le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques dans sa phase deux (PRISE II) comporte la réalisation d'infrastructures d'Approvisionnement en Eau Potable, d'éducation, d'assainissement et de santé en milieu rural et péri-urbain. Il a été identifié à partir du Programme National d'Alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural élaboré sur financement du FAD dans le cadre du Projet Eau et Assainissement en milieu Semi-Urbain (PEASU) et dont le projet PRISE 1 constitue le début de mise en œuvre.

Le projet « PRISE II » a deux sources de financement qui sont le Prêt FAD pour un montant de 50 000 000 UC équivalent à 71 438 500 USD et une contrepartie du Gouvernement de la RD Congo pour un montant de 5 770 000 UC équivalent à 8 244 003 USD. Le budget global est de 55 770 000 d'UC équivalant à 79 682 503 USD au taux de l'accord de 1 UC = 1,42877 USD.

Les activités du projet « PRISE II » se réalisent dans 10 provinces regroupées en deux Pools d'intervention en raison de cinq provinces par Pool. Le Pool Ouest comprend les provinces du Kasai Central, du Kasai, du Kwilu, du Kwango et de Mai-Ndombe tandis que le Pool Est comprend les provinces du Kasai Oriental, Sankuru, Lomami, Haut Lomami et Maniema.

Les activités prévues dans le cadre de la mise œuvre du projet PRISE II sont :

- **la composante de développement des infrastructures** : dans **la catégorie des travaux** par la construction 41 écoles, 40 centres de santé, 207 latrines publiques, installation de 22 mini-réseaux d'AEP en milieu rural, la construction des bâtiments des Régies Provinciales de service public de l'eau dont l'un à Mbujimayi et l'autre à Kananga ; puis dans **la catégorie services**, , l'activité de contrôle et surveillance des travaux d'AEP en milieu rural et l'activité d'Information, Education et Communication, et enfin dans **la catégorie des biens** par l'acquisition et fourniture d'équipements et mobiliers scolaires et d'équipement médicaux pour les centres de santé.
- **La composante de renforcement des capacités**, l'acquisition des matériels roulants, mobiliers de bureaux, matériels informatiques dans la catégorie services, l'activité de renforcement des capacités des acteurs, l'activité d'études et assistance aux réformes du secteur AEPA dans la catégorie services.
- **La composante de la coordination et gestion** concerne les activités des consultants ponctuels du projet, les différents audits ; l'actualisation des Manuels des procédures et indemnités du personnel du projet et le fonctionnement de la gestion courante du Projet.

A ce jour, les contrats de construction de bâtiments scolaires, de centres de santé, d'espaces à vivres, des bâtiments de régies provinciales de service public de l'eau, d'espaces à vivres ainsi que ceux de mini-réseaux d'AEP ont été signés et l'exécution des travaux se poursuit sur tous les sites identifiés et retenus.

Il est à signaler que le démarrage des travaux de 19 mini-réseaux d'AEP en milieu rural a débuté depuis le mois d'avril 2025 avec les essais des débits des forages et les contrats pour le 7ème Lot de 3 AEP de la Province de Lomami seront signés ultérieurement.

Pour les biens, quelques contrats ont été signés afin d'acquérir des matériels informatiques pour la Coordination de l'UEP PRISE, les matériels informatiques pour la CSPP/Finances, les mobiliers et équipements de bureau pour l'UEP/PRISE, mobiliers et équipements de bureau pour la CSPP/FINANCES, les matériels roulants pour l'UEP-PRISE/DIAR, pour la CSPP, pour les différentes brigades d'assainissement. Tandis que le contrat d'acquisition des équipements des maternités ciblées dans six (06) hôpitaux généraux a été signé au mois de juin 2025 et la livraison s'est clôturée en janvier 2026.

Dans la catégorie service, 4 contrats ont été signés en 2025 pour les consultants, le premier qui s'occupe du volet environnement pour lequel le contrat a été clôturé de même que pour l'actualisation de manuel de gestion financière du Projet. Le dernier en cours est celui de l'expert en eau et assainissement qui est signé en août 2024 qui était prorogé pour une année. Au premier trimestre, le 19 mars 2026, 1 seul contrat de service a été signé pour le service d'audit environnemental. Il devra se clôturer en date du 4 juin 2026.

Dans le présent rapport nous passons en revue l'état d'exécution du projet PRISE II au 31 mars 2026 dans son cadre global et par apport au PTBA 2026.

I.1. APERÇU GÉNÉRAL

La deuxième phase du Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques (PRISE) dans la Région du Centre est conforme au PNEHA 2030 visant à accroître le taux d'accès à l'eau potable de 33 % à 80 %, à améliorer l'assainissement et l'hygiène pour tous ainsi qu'à éradiquer la défécation à l'air libre pour le quintile le plus pauvre d'ici 2030 moyennant un investissement de plus ou moins 7 milliards de dollars américains 0,7 Milliard investissement par an (*Africa Finance Minister's Meeting November 2020-country over view*) et le Projet PRISE s'inscrit dans cette dynamique gouvernementale avec l'appui de la Banque Africaine de Développement qui vise à l'amélioration des conditions socio-économiques et sanitaires ainsi que la résilience des populations congolaises à :

- (i) améliorer le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les zones rurales et péri-urbaines des provinces ciblées ;
- (ii) améliorer les taux de scolarisation et d'accès aux soins de santé des populations ; et
- (iii) renforcer la capacité des différents acteurs du secteur. Les bénéficiaires directs des résultats du projet sont les populations rurales estimées à 870 908 personnes réparties dans 10 provinces de la RDC.

D'un coût total de 55,77 millions d'UC dont 50 millions financé par un prêt FAD et 5,77 millions par la contrepartie du gouvernement. Le projet sera exécuté sur une période de 5 ans.

Les bons résultats enregistrés dans 5 provinces pendant la première phase et dans 10 provinces pendant la seconde phase en cours ont poussé le gouvernement à élaborer un programme similaire dans 26 provinces de la RDC à travers PADER (Programme d'Appui au Développement Rural lancé le 3 janvier 2025).

Le Projet PRISE II vise à améliorer les indicateurs généraux de santé dans le pays à travers un accès durable, à l'éducation, à l'assainissement et à l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène par la construction des 22 AEP, 41 écoles, 40 centres de santé et 207 latrines publiques, contribuant ainsi à l'amélioration de la résilience des populations face au changement climatique.

I.2. DONNÉES DE BASE DU PROJET

Emprunteur : Gouvernement de la République Démocratique du Congo.

Organe d'exécution : Secrétariat Général du Développement Rural 1211, croisement des avenues le Premier Mall (Ex TSF) et lieutenant-colonel Lukusa Commune de la Gombe/Kinshasa République Démocratique du Congo Tel :

Email : developpementr@gmail.com

Sources de financement :

- Montant (UC) Instrument FAD : 50,00 millions (Prêt FAD).
- Montant (UC) Gouvernement 5,77 millions contrepartie du Gouvernement.
- Coût total : 55,77 millions en (UC).

Durée-principales étapes (Attendues)

- Approbation de la note conceptuelle : Aout 2021
- Approbation du projet : Décembre 2021
- Signature de l'accord de prêt : Mars 2022
- Entrée en vigueur : Avril 2022
- Dernier décaissement : Avril 2027
- Date d'Achèvement : 31 décembre 2026 prolongée au 31 décembre 2028

I.3. ZONE D'INTERVENTION DU PROJET

La zone d'intervention du PRISE II couvre 10 provinces dans la partie centrale de la RDC et d'après les données publiées par l'INS en 2020, la population de ces provinces est estimée à 35,6 millions habitants, soit environ 36,2 % de la population congolaise qui est estimée à 98,4 millions d'habitants.

Elles vivent essentiellement des activités relevant de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat. Les maladies les plus fréquentes identifiées dans ces provinces sont les maladies diarrhéiques qui sont présentes dans la totalité des localités, suivies par les maladies de la peau. Les eaux souterraines et sources d'eau à faible débit relativement constants constituent les premières sources d'alimentation en eau dans cette zone. Les taux de couverture en eau potable et d'accès à l'assainissement dans cette zone ne dépasseraient pas 30,90 % pour l'eau potable et 22,50 % pour l'assainissement.

Les principaux bénéficiaires directs sont les populations de quelques 41 agglomérations rurales de dix provinces notamment les femmes et les enfants qui supportent la charge d'approvisionnement des ménages en eau potable. Ils sont estimés à 870 908 personnes réparties comme suit :

- (i) 440.000 personnes pour l'eau potable ;
- (ii) 4.400 personnes pour l'assainissement ;
- (iii) 24.600 personnes (élèves) pour l'éducation de base ; et
- (iv) 400.000 personnes pour les soins de santé. A cette situation, s'ajoute la création de 333 emplois permanents et des milliers d'emplois temporaires (1575).

Les actions de renforcement des capacités, sous forme de formation, d'appui au déploiement des unités opérationnelles, d'équipements informatiques et bureautiques et matériels roulants, bénéficieront aux services techniques de l'Etat chargés du développement du monde rural, de la santé, de l'assainissement et de l'éducation. Il s'agit des régies provinciales pour lesquelles des locaux seront construits et équipés, la future Direction des infrastructures et aménagement rural, de

la Coordination provinciale de l'environnement (CPE) et des brigades d'assainissement de la zone du Projet. De même, les collectivités locales ainsi que les entités territoriales décentralisées et les provinces font partie également des bénéficiaires du renforcement des capacités notamment dans la maîtrise d'œuvre.

Carte de la zone du projet PRISE II



I.4. DESCRIPTION DU PROJET

I.4.1. But et Objectif du projet

Le Projet a pour objectif global de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations congolaises. Plus spécifiquement, il vise à assurer un accès durable et inclusif des femmes et des hommes de la Région du Centre de la RDC à l'eau potable, l'assainissement, la santé, l'éducation et aux emplois.

I.4.2. Composantes et objectifs spécifiques

Pour atteindre ces objectifs, les principales actions retenues par le Projet sont regroupées dans les trois composantes ci-après :

- Composante A : Développement des infrastructures (AEPA, écoles, Centres de Santé, Latrine publique.)
- Composante B : Etudes et Renforcement des capacités

- Composante C : Coordination et Gestion du projet

1.4.3. Activités du Projet PRISE II par composante et sous composante avec leurs coûts

Les activités à réaliser par le Projet sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Activités du PRISE par composante et sous composante.

Composantes	Activités	Coût en UC
A) Développement des infrastructures	Réalisation de 22 systèmes d'AEP en milieu rural avec énergie solaire/thermique	38.718.108 (69,42%)
	Construction et équipement de 41 écoles avec latrines et éclairage photovoltaïque	
	Construction et équipement de 40 centres de santé y compris éclairage photovoltaïque,	
	Construction de 40 Espaces à Vivres (marchés)	
	Construction de 207 latrines publiques	
	Construction et équipement de deux bâtiments pour les régies provinciales	
	Suivi et contrôle des travaux d'AEP en milieu rural et de construction des écoles, centres de santé, espaces à vivre et latrines publiques	
	Campagne d'IEC (hygiène, l'eau, sante, genre, assainissement et la pérennisation des infrastructures réalisées)	
B) Études et Renforcement des capacités	Formation des jeunes en plomberie et entretien des ouvrages d'AEP et d'assainissement	8.811.593 (15,80%)
	Formation sur le logiciel de gestion financière	
	Sensibilisation des acteurs locaux et ONG sur l'hygiène et la salubrité et à la Maitrise d'ouvrage des infrastructures d'AEPA	
	Formation des cadres du Ministère des Ressources hydrauliques, Développement rural et agents du CNAEHA en gestion d'une base de données	
	Formation des Brigades d'Assainissement (BA) et des Techniciens de l'Environnement (TE) ainsi que les Facilitateurs Communautaires (FC)	
	Formation des Autorités Provinciales Administratives pour leur implication aux activités de lutte contre la défécation à l'air libre dans les sites du projet	

Composantes	Activités	Coût en UC
	Campagne locale d'IEC pour le changement de comportement en Genre sur l'hygiène, l'assainissement et la nutrition	
	Promotion d'actions intégrées WASH, Santé et Nutrition : - au niveau individuel et du ménage : Campagnes d'information et de sensibilisation sur les comportements WASH qui limitent la transmission oro-fécale et permettent d'éviter les maladies - au niveau communautaire : Mise en œuvre de l'ATSM (Assainissement Total et Sanitation Marketing) qui combine l'ATPC et le Marketing de l'assainissement.	
	Identification, structuration et formalisation des PME des femmes et des filles en vue dans les rendre éligibles au financement AFWA ; et leur Formation en entrepreneuriat, en NTIC, en recherche de financement... ainsi que la promotion d'AGR (genre et création d'emplois) autour d'une agriculture durable et adaptée au climat avec une gestion adéquate de l'eau et des sols	
	Appui à la mise œuvre du plan genre (volets formation et apprentissage des femmes et des filles, et violences faites aux femmes) de la RDC.	
	Voyages d'échanges des bénéficiaires du CMG à l'intérieur du pays, dans la sous-région et en Afrique de l'ouest.	
	Voyages d'études dans la sous-région	
	Renforcement des capacités des acteurs (l'appui à la mise en place de la délégation de service publique (aspects institutionnels, réglementaires et légaux, recrutement et opérationnalisation y compris monitoring))	
	Etudes et assistance aux réformes du secteur AEPA (maîtrise d'œuvre)	
	Etude de la vulnérabilité climatique du projet	
	Renforcement des capacités sur le changement climatique lié au secteur de l'approvisionnement en eau	
C) Coordination et Gestion du Projet	Fonctionnement (acquisition logistiques, bureautiques et informatiques, logiciel de comptabilité, frais de missions, rémunération personnel national et DPO du projet,	8.240.299 (14,78%)

Composantes	Activités	Coût en UC
	consommables, carburant...), pour l'UEP du projet et ses bureaux de Pools,	
	Actualisation du manuel des procédures du PRISE.1	
	Services d'assistance technique pour la mise en œuvre du Projet,	
	Suivi Environnemental et social et Audit environnemental et social	
	Missions Audits des comptes, environnemental et des acquisitions.	

I.5. DÉTAILS DES COÛTS DU PRISE PAR ACTIVITÉ DES RESSOURCES DU PROJET.

Tableau 2 : Coûts des activités par composante et par source de financement (en millions d'UC).

COMPOSANTE A- DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES		COMPOSANTE B - AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE SECTORIELLE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES					
Catégories	Prêt FAD	Catégories	Prêt FAD	Gouvernement	Catégories	Coûts	
A1 TRAVAUX		B1 BIENS			C1 SERVICES		
A1.1 Construction des mini-réseaux d'AEP en milieu rural	12 010 331	B1.1 Matériel roulant	513 729		C 1.1 Honoraires Consultants ponctuels du projet	331 754	
A1.2 Réhabilitation et Construction des Ecoles primaires	5 452 242	B1.2 Mobilier de bureaux	59 117		C 2.4 Audit des comptes, Acquisitions et Manuels	2 072 099	1 499 300
A1.3 Réhabilitation et construction des Centres de Santé	4 479 377	B1.3 Matériels Informatiques	35 765				
A1.4 Réhabilitation et Construction des Espace à vivre	6 999 027	B1.4 Equipements Divers	258 964				
A1.5 Construction des latrines publiques	911 553						

COMPOSANTE A- DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES		COMPOSANTE B - AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE SECTORIELLE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES					
A1.6 Construction des Bureaux pour les régies provinciales	279 961						
Sous-total A1	30 132 492	Sous-total B1	867 575		Sous-total C1	2 403 853	1 499 300
A2 SERVICES		B2 SERVICES			C2 FONCTIONNEMENT		
A2.1 Contrôle et surveillance des travaux de construction des écoles, centres de santé, latrines publiques et espaces à vivre	419 942	B.2.1 Renforcement des capacités des acteurs	1 294 515	644 683	C 1.2 Indemnités du personnel du projet	2 114 826	
A2.2 Contrôle et surveillance des travaux AEP Rural	1 749 757	B.2.2 Etudes et assistance aux réformes du secteur AEPA	5 848 449	3 100 000	C2.1 Frais de missions et voyages	712 291	
A2.3 Campagne d'IEC	765 656				C2.2 Frais de fonctionnement des	1 274 523	

COMPOSANTE A- DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES		COMPOSANTE B - AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE SECTORIELLE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES					
					véhicules et moto du projet		
					C2.3 Frais divers de gestion	419 531	1 472
Sous-total A2	2 935 355	Sous-total B2	7 142 964	3 744 683	Sous total Fonctionnement	4 521 171	1 472
A3 BIENS							
A3.1 Mobiliers scolaires	542 355						
A3.2 Equipements médicaux	1 588 079						
Sous-total A3	2 130 434						
Coût de base composante A	35 198 280	Coût de base composante B	8 010 539	3 744 683	Coût de base composante C	5 990 409	1 500 771
Imprévus physiques	2 463 880	Imprévus physiques	560 738	262 128	Imprévus physiques	419 329	105 054

COMPOSANTE A- DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES		COMPOSANTE B - AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE SECTORIELLE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES					
Hausse des prix	1 055 948	Hausse des prix	240 316	112 340	Hausse des prix	179 712	45 023
Total Composante A	38 718 108	Total Composante B	8 811 593	4 119 151	Total composante C	6 589 450	1 650 849
Coût de base du Projet	45 454 545				5 245 454		
Imprévus physiques	3 181 818				367 182		
Hausse des prix	1 363 636				157 364		
Total coût du Projet	50 00 000 (part de Prêt FAD)				5 770 000 (Part du gouvernement)		

RAPPEL DES ACTIVITES DU PRISE II AU 31/12/2024

Le projet est entré en vigueur avec la signature de l'accord du Prêt FAD le 01 mars 2022 mais le premier décaissement n'était intervenu qu'à la date du 10 janvier 2023 soit une année après la signature des accords ce qui implique une année de retard dans l'avancement du projet.

Durant l'année 2022, l'essentiel était focalisé dans la négociation de la Phase II du PRISE ; la signature de l'Accord de prêt et la mise en place de l'équipe de la gestion du projet (signature de l'arrêté par le ministre de la tutelle en date 14 mars 2023 ; notification du personnel par le secrétaire général en date du 28 mars 2023, recrutement du personnel additionnel) et aux satisfactions des conditions du premier décaissement ;

L'Année 2023 a été caractérisée par le lancement du projet PRISE II du 15 au 16 février 2023, la signature des quatre contrats pour les acquisitions des matériels informatiques et équipements des bureaux pour la Coordination National (DIAR) et la CSPP ; la signature de deux contrats pour la construction des bureaux pour les Régions provinciales de Kasai-Oriental et du Kasai Central ; 35 contrats pour les Travaux de Réhabilitations des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines ainsi que la construction des places à vivre et la fourniture des mobiliers scolaires dans les dix provinces de la zone du projet.

L'Année 2024 a permis la signature des contrats restants pour les infrastructures scolaires, sanitaires, d'assainissement et d'espaces à vivre. 13 contrats ont été signés pour les travaux, 1 contrat pour les services du consultants AEP.

Ramenant ainsi le nombre total des contrats signés à 58, répartis comme suit : 45 contrats des travaux, 10 contrats d'acquisitions des biens et 3 contrats de service des consultants.

II.1. LOCALISATION DES ACTIVITÉS DU PRISE II DANS LE POOL OUEST

Le Pool Ouest du projet est constitué des 5 provinces dont le Kasai Central, le Kasai, le Kwilu, le Kwango et le Mai-Ndombe.

Tableau 3. : Répartition des sites par province du Pool Ouest

Localisation			Infrastructures					
Province	Territoire	Site	AEP	EP	CS	EV	LP	Régie
Kasai Central	Kananga	Kananga						1
	Dibaya	Luekeshi	1	1	1	1	6	
	Luiza	Luambo	1	1	1	1	6	
		Kalamba Mbuji	1	1	1	1	6	
	Demba	Bena Kayembe		1		1	5	
		Tshibungu			1		1	
	Kazumba	Kalume Kamue		1	1	1	6	
TOTAL 1			3	5	5	5	30	1
Kasai	Tshikapa	Kamuesha	1	1			4	
		Mwila Mbumba				1	1	

Localisation			Infrastructures					
Province	Territoire	Site	AEP	EP	CS	EV	LP	Régie
		Ntumba Kapangu			1		1	
		Loange	1	1		1	5	
		Bondo 2			1		1	
		Kabambayi Secteur	1	1		1	5	
		Lukombo			1		1	
	Mweka	Kakenge		1	1	1	6	
TOTAL 2			3	4	4	4	24	
Kwilu	Bulungu	Musiele Ngunu		1	1	1	4	
		Kwenge Centre	1	1	1	1	4	
	Gungu	Mukedi	1	1	1	1	4	
	Idiofa	Kalo		1			2	
	Masimanimba	Masamuna	1		1	1	2	
		Munzabala			1	1	2	
		Kitoy Yassa		1			2	
TOTAL 3			3	5	5	5	20	
Kwango	Kenge	Kenge II		1			2	
		Kitati			1		1	
		Kolokoso Secteur		1			2	
		Tsakala				1	1	
		Misele Centre		1		1	3	
		Misele Pont			1		1	
		Katoy 316		1	1	1	4	
TOTAL 4				4	3	3	14	
Mai-Ndombe	Mushie	Mushie		1	1	1	4	
		Mbali		1		1	3	
		Bosiki			1		1	
	Kutu	Mbie Kasai		1	1	1	4	
TOTAL 5				3	3	3	12	
TOTAL GENERAL			9	21	20	20	100	1

Tableau 4. : Nombre d'ouvrages par province

Province	Ouvrages					
	AEP	EP	CS	EV	LP	Régie Provinciale
Kasai Central	3	5	5	5	30	1
Kasai	3	4	4	4	24	
Kwilu	3	5	5	5	20	
Kwango		4	3	3	14	
Mai-Ndombe		3	3	3	12	
TOTAL	9	21	20	20	100	1

En ce qui concerne la Sous-Composante « **Construction/Réhabilitation des Bâtiments Scolaires, Centres de Santé et des Latrines Publiques, ainsi que l'Aménagement des Espaces à Vivres et la fourniture des Mobiliers Scolaires** », les ouvrages répartis sur les cinq (05) Provinces du Pool Ouest sont : 21 Ecoles Primaires, 20 Centres de Santé, 20 Espaces à Vivres, 100 Latrines Publiques.

Pour la Sous-Composante « **Construction et équipement d'un Bâtiment pour la Régie Provinciale du Service Public de l'eau dans la Province du Kasai Central** », la construction et l'équipement en mobiliers et matériels informatiques sont prévus à Kananga.

Concernant les travaux relatifs à la Sous-Composante « **Réalisation des systèmes de mini-réseaux d'eau Potable (AEP) en Milieu Rural avec énergie solaire/thermique** », il est prévu la réalisation des 9 mini-réseaux d'Approvisionnement en Eau Potable (AEP) répartis sur les Provinces du Kasai Central, Kasai et Kwilu, en raison de trois (03) sites par province.

II.2. LOCALISATION DES ACTIVITÉS DU PRISE II DANS LE POOL EST

Le Pool Est du projet est constitué des 5 provinces dont le Kasai Oriental, le Sankuru, le Maniema, le Haut Lomami et la Lomami.

Tableau 5 : Répartition des sites par province du Pool Est

Localisation			Infrastructures					
Province	Territoire	Site	AEP	EP	CS	EV	LP	Régie
Kasai Oriental	Mbuji Mayi	Mbuji Mayi						1
	Tshilenge	Mpanda/Mukeba	1	1	1	1	6	
		Bena Kabinda	1	1	1	1	7	
	Kabeya Kamwanga	Mulowayi	1	1	1	1	6	
		Tshilundu	1					
		Dikundi		1		1	5	
		Ciaciacia		1	1	1	6	
		Bena Kazadi		1	1	1	7	
	Mupompa	Mupomba		1	1	1	6	
TOTAL 1			4	7	6	7	43	
Sankuru	Katako Kombe	Djalo	1					
		Wembo Nyama		1	1	1	4	
	Lomela	Mukumari	1	1	1	1	4	
	Lusambo	Bakwa Bumba	1	1	1	1	4	
TOTAL 2			3	3	3	3	12	
Lomami	Kabinda	Mulemayi		1	1	1	6	

Localisation			Infrastructures					
Province	Territoire	Site	AEP	EP	CS	EV	LP	Régie
		Kabinda		1	1	1	6	
		Bakwa Mulumba/Tshileu		1	1	1	7	
	Luilu	Kanyiki Mutembwe		1	1	1	6	
	Ngandajika	Kalambayi		1	1	1	6	
TOTAL 3				5	5	5	31	
Haut Lomami	Kanima	Kaniama		1	1	1	4	
		Mwadi Kayembe		1	1	1	4	
		Kabongo		1	1	1	4	
TOTAL 4				3	3	3	12	
Maniema	Kibombo	Difuma 2	1	1	1	1	4	
		Lowe	1					
		Kibombo	1	1	1	1	4	
		Tunda		1	1	1	4	
TOTAL 5			3	3	3	3	12	
TOTAL GENERAL			10	21	20	21	110	

Tableau 6 : Nombre d'ouvrages par province

Province	Ouvrages					
	AEP	EP	CS	EV	LP	Régie Provinciale
Kasaï Oriental	4	7	6	7	43	1
Sankuru	3	3	3	3	12	
Lomami		5	5	5	31	
Haut Lomami		3	3	3	12	
Maniema	3	3	3	3	12	
TOTAL	10	21	20	21	110	1

En ce qui concerne la Sous-Composante « **Construction/Réhabilitation des Bâtiments Scolaires, Centres de Santé et des Latrines Publiques, ainsi que l'Aménagement des Espaces à Vivres et la fourniture des Mobiliers Scolaires** », les ouvrages répartis sur les cinq (05) Provinces du Pool Est sont : 21 Ecoles Primaires, 20 Centres de Santé, 21 Espaces à Vivres, 110 Latrines Publiques.

Pour la Sous-Composante « **Construction et équipement d'un Bâtiment pour la Régie Provinciale du Service Public de l'eau dans la Province du Kasaï Oriental** », la construction et l'équipement en mobiliers et matériels informatiques sont prévus à Mbuji Mayi.

Concernant les travaux relatifs à la Sous-Composante « **Réalisation des systèmes de mini-réseaux d'eau Potable (AEP) en Milieu Rural avec énergie solaire/thermique** », il est prévu la réalisation des 13 mini-réseaux d'Approvisionnement en Eau Potable (AEP) répartis sur les Provinces du Kasai Oriental, Sankuru, Maniema et Lomami.

Tableau 7 : Répartition des contrats par province et durée des travaux dans le Pool Ouest

N°	Contrat	Entreprise	Date estimative de démarrage	Durée des travaux
1. PROVINCE DU KASAI CENTRAL				
01	004	GCK	13/11/2023	7 mois
02	017	RAM CONSTRUCT	08/01/2024	12 mois
03	018	Ets ASPHAR	08/01/2024	12 mois
04	019	ADIMIREC	08/01/2024	12 mois
05	020	ENTRASCO	08/01/2024	12 mois
06	021	ENTRASCO	08/01/2024	12 mois
2. PROVINCE DU KASAI				
01	022	AGIES	08/01/2024	12 mois
02	023	AGIES	08/01/2024	12 mois
03	049	CODIBAKAV	22/05/2024	12 mois
04	055	GVRD	25/06/2024	12 mois
3. PROVINCE DU KWILU				
01	024	SOCIETE LUKU	08/01/2024	12 mois
02	025	GROUP MDL/CAPS Engineering Sarl	08/01/2024	12 mois
03	026	GROUP MDL/CAPS Engineering Sarl	08/01/2024	12 mois
04	027	SOCIETE LUKU	08/01/2024	12 mois
05	028	BUREAU ETRE	08/01/2024	12 mois
06	029	BUREAU ETRE	08/01/2024	12 mois
4. PROVINCE DU KWANGO				
01	038	SERRU-TOP	29/01/2024	12 mois
02	039	SCC	29/01/2024	12 mois
03	054	RTM	22/05/2024	11 mois
04	063	POWER	09/07/2024	12 mois
5. PROVINCE DE MAI-NDOMBE				
01	030	GEBAC	29/01/2024	12 mois
02	031	GEBAC	29/01/2024	12 mois
03	032	SCC	29/01/2024	12 mois

Tableau 8 : Répartition des contrats par province et durée des travaux dans le Pool Est

N°	N° du Contrat	Entreprise	Date estimative de démarrage	Durée des travaux
1. PROVINCE DU KASAI ORIENTAL				
01	007	SOZOKA SARL	15/12/2023	10 mois
02	008	SERRU TOP	15/12/2023	8 mois
03	010	SAF SARL	15/12/2023	12 mois
04	011	SAF SARL	15/12/2023	12 mois
05	014	GCK SARL	30/12/2023	12 mois
06	015	GCK SARL	30/12/2023	12 mois
07	016	GCK SARL	30/12/2023	12 mois
08	040	LATOUR	30/12/2023	12 mois
2. PROVINCE DE LA LOMAMI				
01	041	SOGITRAP	15/12/2023	12 mois
02	009	MBK CO	15/12/2023	12 mois
03	012	SAF SARL	15/12/2023	12 mois
04	013	SAF SARL	15/12/2023	12 mois
05	042	SOZOKA SARL	15/12/2023	12 mois
3. PROVINCE DU SANKURU				
01	050	SAGEC-KAT	29/01/2024	12 mois
02	033	SCICO SARL	29/01/2024	12 mois
03	034	SCICO SARL	29/01/2024	12 mois
4. PROVINCE DU HAUT LOMAMI				
01	035	JET SARL	29/01/2024	12 mois
02	036	SAM SARL	29/01/2024	12 mois
03	037	SOZOKA SARL	15/12/2023	12 mois
5. PROVINCE DU MANIEMA				
01	051	ECBG	29/01/2024	12 mois
02	052	SAGEC-KAT	29/01/2024	12 mois
03	053	SAGEC-KAT	29/01/2024	12 mois

Les tableaux ci-haut reprennent le nombre des entreprises générales de construction des écoles primaires, centres de santé, espaces à vivres (marchés) et latrines publiques, y compris l'éclairage photovoltaïque, cela par province.

Aussi, au Kasai Oriental dans la ville Mbuji-Mayi ainsi qu'au Kasai Central dans la ville de Kananga, les contrats respectifs n°008 et n°004 concernent la construction du bâtiment de la régie provinciale du service public de l'eau.

Les dates contractuelles d'achèvement des travaux renseignent que tous les travaux légers devraient durer au maximum 12 mois et 7 mois au minimum et, prendraient fin le 18 décembre 2024 au plus tard.

ACTIVITES REALISEES EN 2025

L'année 2025 a été marquée par la signature des contrats et le démarrage des travaux d'AEP ainsi que par la réception provisoire des certaines autres infrastructures socio-économiques. Ainsi, 6 contrats sur 7 ont été signés pour la réalisation en milieu rural des travaux de 19 mini-réseaux d'AEP sur 22.

Le 7ème Lot de 3 mini-réseaux prévus pour la Province du Lomami qui a été infructueux est à relancer. Il est à signaler que les travaux d'essai des débits des forages sont en cours sur 5 sites au moins dont 3 essais ont été déclarés réussis.

Suivant le Plan de Passation des Marchés (PPM) et le Programme de Travail 2025, il a été planifié pour les activités à réaliser dans cette période, une prévision de 31 837 270,50 USD soit 22 298 442,69 UC au taux initial de 1 UC = 1,42778 USD.

Ce montant était réparti par sources de financement comme suit : 25 750 414,32 USD à financer sur le Prêt FAD et 6 446 83 USD sur le fonds de contrepartie du Gouvernement de la RDC.

Tableau 9 : répartition des prévisions 2025 par sources de financement

N°	Projets/ Sources de financement	Budget/PTBA 2025 en USD
1	Prêt FAD/BAD	30 405 162,30
2	Contrepartie/ Gouvernement	1 432 108,20
	Total	31 837 270,50

Le Tableau 10 : Répartition des prévisions 2025 par Catégorie

N°	Projets/ Catégories	Prévisions/PTBA 2025 en USD
1	Travaux	22 640 528,59
2	Biens	3 118 077,40
3	Services	3 668 595,52
4	Fonctionnement	2 410 069,00
	Total Coût de base	31 837 270,50
	Total	31 837 270,50

III.1. DETAIL DES EXECUTIONS PHYSIQUES DE 2025 SUIVANT LES CATÉGORIES DES ACTIVITÉS

L'exécution des activités de 2025 par catégorie se présente de la manière suivante :

III.1.1. Travaux

Pour les travaux, il était question de poursuivre l'exécution des travaux de construction des infrastructures scolaires, de santé d'assainissement et d'espaces à vivres pour lesquels 45 contrats ont été attribués à la fin de l'année 2024 pour atteindre le nombre d'infrastructures retenues.

Les contrats pour la construction de 41 écoles, 40 centres de santé, 40 espaces à vivre, 2 bureaux des régies provinciales de service public d'eau et 207 latrines. Il est à signaler que le nombre total des contrats des travaux signés par l'UCP PRISE est de 51.

Les 51 contrats des infrastructures scolaires, sanitaires, d'assainissement, d'espaces à vivres ainsi que les bâtiments de deux régies provinciales de service public de l'eau et de mini-réseaux d'AEP ont été signés pour un montant total de Dollars 26 185 376,54 USD.

Pour les mini-réseaux d'AEP, les contrats ont été signés début janvier 2025 pour 19 sites sur 22 et les travaux ont démarré à partir d'Avril 2025. Le 7^{ème} lot (3 AEP dans la Province de Lomami), déclaré infructueux fera l'objet d'une relance. Les travaux des 19 sites se déroulent dans les 6 Provinces du Kasai Oriental, Sankuru, Maniema, Kasai Central, Kasai, et Kwilu.

A ce jour les travaux se déroulent normalement et ont atteint en ce qui concerne les infrastructures scolaires, sanitaires, d'assainissement et les espaces à vivres un taux moyen d'environ 75 %, tandis les travaux de construction de deux bureaux des régies provinciales du Kasai Central et Oriental ont un taux respectif de 100% et 50 %.

III.1.2. Biens

En ce qui concerne les biens de la composante A, le programme prévoyait l'acquisition de matériels médicaux et de stock de médicaments essentiels pour le bon fonctionnement des centres de santé, des équipements et matériels complémentaires pour le Centre Multifonctionnel Genre de Mbujimayi et l'acquisition des mobiliers scolaires.

Les mobiliers scolaires ont été commandés au travers les contrats de travaux d'écoles primaires pour permettre à ce que la fin des travaux coïncide directement avec la remise des mobiliers. Chaque école bénéficiera de 150 bancs pupitres, 6 tables, armoires et 6 chaises.

La livraison des matériels médicaux et des médicaments essentiels a démarré au troisième trimestre 2025 et se poursuit. La livraison des équipements pour les maternités des hôpitaux généraux était prévue à la période entre fin 2025 et début janvier 2026.

Pour ce qui est de 3000 foyers améliorés le projet a déjà procédé à la signature du contrat avec le fournisseur et nous attendons la livraison au premier semestre 2026.

Dans la catégorie B, d'étude et renforcement des capacités, les contrats des différents biens prévus ont été signés et certains fournis et d'autres en attente d'être fournis. Pour les biens qui ont été fournis au 31 décembre 2025, il s'agit de :

- Matériels informatiques pour la Coordination de l'UCP PRISE II ;
- Matériels informatiques pour la CSPP/Finances ;
- Mobiliers et équipements de bureau pour l'UCP PRISE II ;
- Mobiliers et équipements de bureau pour la CSPP/FINANCES ;
- Mobiliers et équipements pour les régions provinciales du Kasai Central et du Kasai-Oriental ;
- Matériels informatiques pour les régions provinciales du Kasai Central et du Kasai Oriental.

S'agissant des marchés d'acquisition des matériels roulants il a été relevé ce qui suit :

- Le lot 01 et le Lot 03 relatifs à l'acquisition de Deux (2) véhicules 4x4 station wagon pour la Direction/Coordination du Projet/DIAR ainsi que l'acquisition d'un Minibus de 16 places pour la CSPP/Ministère des Finances à livrer à Kinshasa ont été résilié pour non-exécution et dépassement de taux de pénalité au-delà de 10 % ;
- Le Lot 02 est en cours de livraison dont l'achèvement est projeté au 28/02/2026 ;
- Les Trente-six (36) Motos Monocylindre 2 temps dont 13 livrés à Kananga pour l'axe d'intervention et la Brigade d'Assainissement, 13 livrés à Mbuji-Mayi pour l'axe d'intervention et la Brigade d'Assainissement, 4 livrées à Tshikapa, 4 livrés à Bandundu Ville pour leurs Brigades d'Assainissement et 2 livrées à Kabinda pour la Brigade d'Assainissement, cela conformément au Lot 03 ont été livrés à 100 %.

III.1.3. Services

Dans la catégorie service, 6 contrats ont été signés, il s'agit de contrat de :

- Assistance Technique au Renforcement de Capacités du Personnel de Gestion Financière du Projet PRISE II en vue de la Migration Informatique du Système Comptable en Conformité avec le SYCEBNL et la Sécurisation ainsi que la Sauvegarde des Bases de Données Comptables ;
- Assistance Technique au Renforcement de Capacités du Personnel de Gestion Financière des Projets en vue du Basculement sur le Système Comptable des Entités à But non Lucratif (SYCEBNL) ;
- Services de Consultant Individuel chargé de l'audit indépendant des acquisitions passées suivant le système national exercices 2023 et 2024 ;

- Services de consultant/Firme chargé de contrôle et de surveillance des travaux de forage et mini-réseaux d'AEP dans les provinces du Kasai-Oriental, Lomami, Sankuru et Maniema ;
- Services de consultant/Firme chargé de contrôle et surveillance des travaux de forage et min- réseaux dans les provinces du Kasai central, du Kasai et du Kwilu.

Quatre contrats ont été exécutés à 100 % à savoir : les Services du consultant de courte durée chargé d'actualisation du manuel des procédures administratives, comptables et financières et formation comptables ; les Services Consultant Individuel Expert en Gestion Environnementale et Sociale ; les Services d'Assistance Technique au Renforcement de Capacités du Personnel de Gestion Financière du Projet PRISE II en vue de la Migration Informatique du Système Comptable en Conformité avec le SYCEBNL et la Sécurisation ainsi que la Sauvegarde des Bases de Données Comptables ainsi que les services d'Assistance Technique au Renforcement de Capacités du Personnel de Gestion Financière des Projets en vue du Basculement sur le Système Comptable des Entités à But non Lucratif (SYCEBNL).

III.1.4. Fonctionnement

Un montant de 1 771 891,52 USD a été alloué au fonctionnement et la gestion courante de l'UCP PRISE II notamment sur les missions de terrain, les indemnités du personnel, les frais de carburant, les différents entretiens des véhicules, la communication et les frais de mission de terrain.

EXECUTION DU PROGRAMME D'ACTIVITES ET BUDGET ANNUEL 2026

IV.1. PROGRAMME DES ACTIVITES POUR 2026

Les principales activités programmées pour 2026 sont :

- Lancement des travaux pour le lot de mini-réseau d'AEP restant, à savoir 3 AEP dans la province de la Lomami ;
- Atteindre au moins un taux d'exécution physique de 80 % au 31/12/2026 pour les 6 lots de mini-réseaux d'AEP (19 sites) qui sont en cours d'exécution effective depuis juin 2025 pour une durée totale de 24 mois ;
- Achèvement de tous les travaux d'Ecoles, Centres de Santé, Espaces à Vivres, Latrines Publiques ainsi que les travaux du Bâtiment de la Régie Provinciale du Service Public de l'Eau au Kasai Oriental ;
- Lancement de l'étude d'actualisation du PN-AEPA et des études géophysiques pour des provinces de la RDC ;
- Démarrage des activités d'IEC et de formation et sensibilisation locale sur l'Hygiène, la Salubrité et l'assainissement ainsi que sur la gestion, l'entretien et la pérennisation des infrastructures d'AEP, d'éducation, de santé, de vente de vivres et d'assainissement rural ;
- Acquisition du matériel roulant restant ;
- Lancement des activités de renforcement des activités des acteurs locaux notamment les ateliers de vulgarisation de la loi sur l'eau et ses textes d'application, la formation des jeunes plombiers dans 10 provinces du PRISE II dans la réparation et l'entretien des ouvrages de mini-réseaux d'AEP comme appui aux Régies Provinciales du Service Public de l'Eau ;
- Lancement de l'étude sur la gestion des déchets solides pour la ville de Kinshasa.

IV.2. BUDGET ANNUEL 2026

Compte tenu des activités citées ci-haut, le montant global du PTBA 2026 de PRISE II, en termes de prévision de décaissement, conforme au plan de passation des marchés et au rythme de décaissement est ainsi arrêté à **26 586 138,47 USD, soit 19 396 756,27 UC** au taux de conversion au démarrage du Projet 1UC = 1,37 USD, réparti comme suit : **24 462 954,3 USD** sur le Prêt FAD et **2 110 601,78 USD sur les Fonds Propres du Gouvernement.**

Ce budget tient compte de toutes les activités susceptibles d'être exécutées pendant cette période y compris le fonctionnement de l'UEP PRISE. Le tableau suivant donne le détail des engagements et des prévisions de décaissement par composante et sous composante du projet.

Tableau 11: Répartitions des engagements et des dépenses prévisionnelles de 2026 par composante

Composante	Prévisions d'engagement 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en UC	Proportion prévisions des décaissements 2026 en %
Composante A	4 131 448,72	19 316 492,92	14 099 629,87	72,69%
Composante B	3 034 148,59	1 788 613,86	1 305 557,56	6,73%
Composante C	6 404 069,11	5 468 449,31	3 991 568,84	20,58%
Total	13 569 666,42	26 573 556,09	19 396 756,27	100%

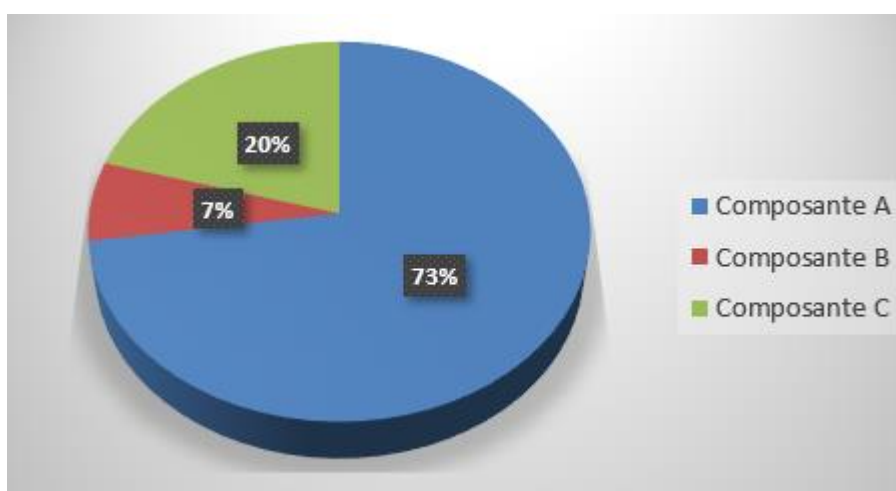


Tableau 12: Répartition des engagements et des dépenses prévisionnelles de 2026 par catégorie.

Catégorie	Prévisions d'engagement 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en UC	Proportion prévisions des décaissements 2026 en %
Travaux	3 231 569,70	16 064 620,10	11 726 000,07	60,45%
Biens	217 569,70	739 709,16	539 933,69	2,78%
Services	6 088 993,77	4 470 939,52	3 263 459,50	16,82%
Fonctionnement	6 085 574,25	5 298 287,31	3 867 363,00	19,94%
Total	13 569 666,42	26 573 556,09	19 396 756,27	100,00%

Graphique de répartition des dépenses prévisionnelles en 2026 par catégorie


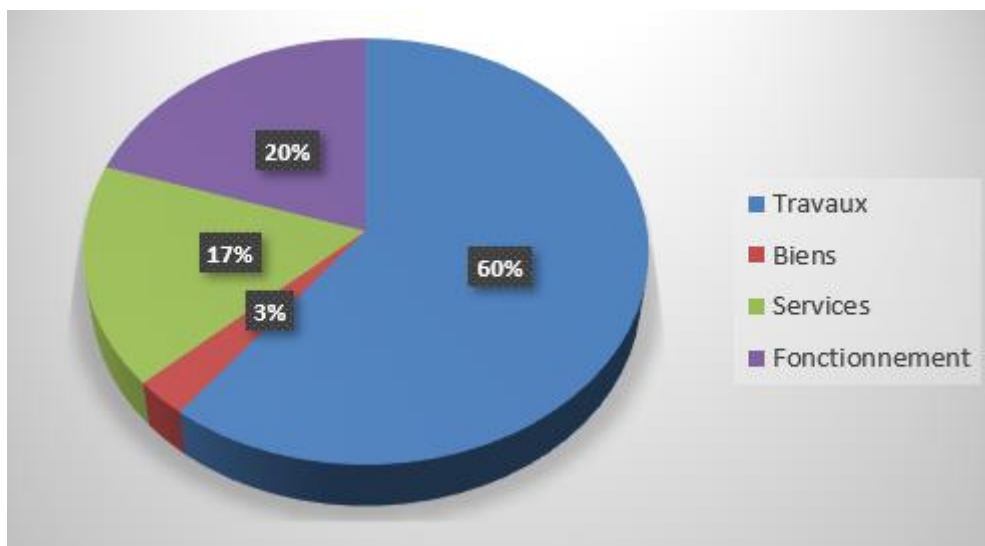


Tableau 13 : répartitions des engagements et des dépenses prévisionnelles de 2026 par source de financement

Financement	Prévisions d'engagement 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en UC	Proportion prévisions des décaissements 2026 en %
Gouvernement	2 110 601,78	2 110 601,78	1 540 585,24	7,94%
Prêt FAD	11 459 064,64	24 462 954,31	17 856 171,03	92,06%
Total	13 569 666,42	26 573 556,09	19 396 756,27	100,00%

Graphique de répartition des dépenses prévisionnelles en 2026 par source financement

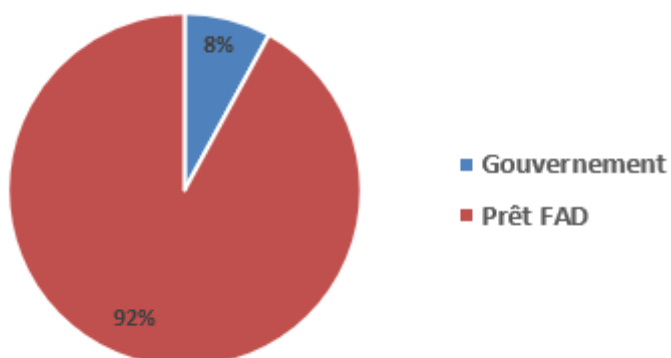

IV.3. DETAIL DES EXECUTIONS PHYSIQUES AU PREMIER TRIMESTRE 2026 PAR CATÉGORIE D'ACTIVITÉS

L'exécution des activités au premier trimestre 2026 par catégorie se présente de la manière suivante :

IV.3.1. Travaux

Pour les travaux, il était question de poursuivre l'exécution des travaux de construction des infrastructures scolaires, de santé, d'assainissement et d'espaces à vivres (marchés) pour lesquels 45 contrats ont été attribués à la fin de l'année 2024 pour atteindre le nombre d'infrastructures retenues.

Les contrats pour la construction de 41 écoles, 40 centres de santé, 40 espaces à vivre, 2 bureaux des régies provinciales de service public d'eau et 207 latrines publiques, ont été attribués. Il est à signaler que le nombre total des contrats des travaux signés par l'UCP PRISE est de 51.

Les 51 contrats des infrastructures scolaires, sanitaires, d'assainissement, d'espaces à vivres ainsi que les bâtiments de deux régies provinciales de service public de l'eau et de mini-réseaux d'AEP ont été signés pour un montant total de Dollars 26 185 376,54 USD.

Pour les mini-réseaux d'AEP, les contrats ont été signés début janvier 2025 pour 19 sites sur 22 et les travaux ont démarré à partir d'Avril 2025. Le 7ème lot (3 AEP dans la Province de Lomami), déclaré infructueux fera l'objet d'une relance. Les travaux des 19 sites se déroulent dans les 6 Provinces du Kasai Oriental, Sankuru, Maniema, dans le Pool Est et, Kasai Central, Kasai, et Kwilu, dans le Pool Ouest.

L'évolution de la situation d'exécution des travaux par catégories entre le 31/12/2025 et le 31/03/2026 est donnée par le tableau suivant :

N°	Activités/travaux	Prévisions totales (Nombres prévus)	Réalisation au 31 / 12 /2025			Réalisation au 31 / 03 /2026		
			Réalisé	En cours de réalisation	Taux d'achèvement (%)	Réalisé	En cours de réalisation	Taux d'achèvement (%)
	TRAVAUX							
1	Espaces à vivre	40	28	12	70 %	31	9	78 %
2	Ecoles Publiques	41	28	13	68 %	31	10	75 %
3	Centres de santé	40	26	14	65 %	29	11	73 %
4	Latrines Publiques	207	135	73	65 %	154	53	74 %
5	Mini réseaux d'AEP en milieu rural	22	-	19	0 %	-	19	0 %
6	Bureaux provinciaux des Régies de service public d'eau potable	2	1	1	50%	1	1	50%

IV.3.2. Biens

En ce qui concerne les biens de la composante A, le programme prévoyait la poursuite de la réception de matériels médicaux et de stock de médicaments essentiels pour le bon fonctionnement des centres de santé et l'acquisition des mobiliers scolaires.

Les mobiliers scolaires ont été commandés au travers les contrats de travaux d'écoles primaires pour permettre à ce que la fin des travaux coïncide directement avec la remise des mobiliers. Chaque école a bénéficié de 150 bancs pupitres, 6 tables, 6 armoires et 6 chaises.

Au 31 mars 2026, un total cumulé de 4800 bancs pupitres sur 6300, 192 chaises/tables/armoires sur un total égal de 252 par type de mobilier scolaire, sont livrés aux différentes écoles primaires bénéficiaires. Quant à l'équipement des centres de santé, 33 sur 40 sont équipés dont 18 totalement et 15 partiellement.

Dans la composante B, « d'étude et renforcement des capacités », les contrats des différents biens prévus ont été signés et certains fournis et d'autres en attente d'être fournis. Il s'agit des biens ci-après :

- La livraison des équipements pour six (06) maternités des hôpitaux généraux (Kenge, Bandundu Ville, Tshikapa, Kananga, Kabeya Kamuanga et Kabinda) était prévue entre fin 2025 et début janvier 2026. Elle a complètement été réalisée en janvier 2026.
- Pour ce qui est de 3000 foyers améliorés, le projet a procédé à la signature du contrat avec le fournisseur, le 22 décembre 2025 et la livraison est en attente.
- Pour ce qui concerne les matériels roulants, le Lot 01 et le Lot 03 relatifs à l'acquisition deux (2) véhicules 4x4 station wagon destinés à la Direction/Coordination du Projet/DIAR ainsi que l'acquisition d'un Mini Bus de 16 places pour la CSPP/Ministère des Finances à livrer à Kinshasa ; les contrats ont été résiliés pour non-exécution et dépassement de taux de pénalité au-delà de 10 %. Deux avis d'appel d'offres ont été publiés le 11 mars 2026 en vue de sélectionner un nouveau fournisseur capable d'assurer la livraison dans le délai requis, soit au deuxième trimestre 2026

IV.3.3. Services

Dans la catégorie service, 2 contrats ont été signés le 28 novembre 2025 et les services attendus se sont poursuivis au premier trimestre 2026. Il s'agit des contrats de :

- Services de consultant/Firme chargé de contrôle et de surveillance des travaux de forage et mini-réseaux d'AEP dans les provinces du Kasai-Oriental, Lomami, Sankuru et Maniema.

- Services de consultant/Firme chargé de contrôle et surveillance des travaux de forage et min- réseaux dans les provinces du Kasai central, du Kasai et du Kwilu.

Pour ce qui concerne le premier trimestre 2026, un seul contrat de service a été signé le 19 mars 2026. Il s'agit des services de consultant individuel chargé de l'audit environnemental et social du projet PRISE phase II, exercices 2023-2024 et 2025.

IV.3.4. Fonctionnement

Un montant de 1 318 619,63 USD a été alloué au fonctionnement et la gestion courante de l'UCP PRISE II notamment pour les frais de carburant, les différents entretiens des véhicules, les indemnités du personnel, la communication et les frais de mission de terrain.

IV.4. ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS DANS LE POOL OUEST

IV.4.1. Travaux de construction des écoles primaires, centres de santé, espaces à vivres, latrines publiques et bâtiment de la régie provinciale du service public de l'eau

Cette section présente les activités de la sous-composante des infrastructures d'éducation, de santé et d'assainissement. Elle revient sur les travaux qui ont été réalisés du début du projet au 31 mars 2026 avec une attention particulière sur les travaux achevés ou en cours au premier trimestre 2026.

Tableau 14 : Répartition des travaux réceptionnés par province du Pool Ouest

N°	N° du Contrat	Entreprise	Date de réception	Observation
1. PROVINCE DU KASAI CENTRAL				
01	004	GCK	18/04/2025	Réception provisoire
02	017	RAM CONSTRUCT	03/04/2025	Réception provisoire
03	018	Ets ASPHAR	03/12/2025	Réception provisoire
04	019	ADIMIREC	24/01/2025	Réception provisoire
05	021	ENTRASCO	24/11/2025	Réception provisoire
2. PROVINCE DU KASAI				
01	049	CODIBAKAV	20/08/2025	Réception provisoire
3. PROVINCE DU KWILU				
01	024	SOCIETE LUKU	24/06/2025	Réception définitive
02	025	GROUP MDL/CAPS Engineering Sarl	03/03/2025	Réception provisoire
03	026	GROUP MDL/CAPS Engineering Sarl	27/06/2025	Réception provisoire
04	027	SOCIETE LUKU	22/06/2025	Réception définitive
05	028	BUREAU ETRE	26/12/2025	Réception technique
06	029	BUREAU ETRE	26/12/2025	Réception technique

N°	N° du Contrat	Entreprise	Date de réception	Observation
4. PROVINCE DU KWANGO				
01	039	SCC	02/06/2025	Réception provisoire
02	054	RTM	18/01/2025	Réception provisoire
03	063	POWER	06-07/02/2026	Réception provisoire
5. PROVINCE DE MAI-NDOMBE				
01	030	GEBAC	04/06/2025	Réception provisoire
02	031	GEBAC	07/06/2025	Réception provisoire

Un total cumulé des 16 sur 23 contrats des travaux de construction des écoles primaires, centres de santé, espaces à vivres, latrines publiques a vu les travaux réceptionnés du début du projet au 31 mars 2026, cela sur l'ensemble des cinq provinces. Le 17ème contrat concerne les travaux de construction du bâtiment de la régie provinciale du service public de l'eau qui ont été aussi réceptionnés.

Sur l'ensemble des 17 contrats dont les travaux sont réceptionnés au 31 mars 2026, les travaux des 2 contrats l'ont été provisoirement en 2024 et leur réceptionnés définitivement est intervenue en juin 2025. Pour ces deux derniers contrats, la durée des travaux a été de cinq (05) mois au lieu de 12 mois contractuels. Cette performance de délai est expliquée par une forte capacité de mobilisation des ressources matérielles, humaines et organisationnelles de l'entreprise.

Par ailleurs, les travaux pour un seul contrat ont été provisoirement réceptionnés au premier trimestre 2026, dans la province du Kwango.

Tableau 15 : Types d'ouvrages réceptionnés pour le Pool Ouest

Type d'ouvrage	Prévision du projet	Cumul de réalisations au 31 décembre 2025	Réalisations au premier trimestre 2026	Cumul de réalisations au 31 mars 2026	
		Réalisés	Prévus	Réalisés	Réalisés Pourcentage
Ecoles primaires	21	15	6	1	16 76 %
Centres de santé	20	14	6	1	15 75 %
Espaces à vivres	20	15	5	1	16 80 %
Latrines publiques	100	69	31	6	75 75 %
Bâtiment de la Régie Provinciale du Service Public de l'Eau à Kananga	1	1	0	0	1 100 %
Taux moyen d'achèvement					80 %

Le tableau ci-dessus présente le nombre par type d'ouvrages et ressort le cumul des ouvrages complètement construits jusqu'à leur réception technique, provisoire ou définitive. Au premier trimestre 2026, il est à noter que les travaux d'un seul contrat ont connu leur réception provisoire par rapport à la prévision trimestrielle. Ces travaux sont constitués d'une école, d'un espace à vives et des trois latrines publiques. Ce qui porte le taux moyen d'achèvement des ouvrages à 80 %.

Des efforts considérables sont fournis par les entreprises en retard d'achèvement en vue de poursuivre les travaux et rattraper des délais déjà impartis. Pour ce faire et après des missions de suivi et contrôle, le projet a régulièrement (1) exigé aux entreprises de fournir un chronogramme d'achèvement des travaux actualisé, (2) appliqué les pénalités de retard de délais aux entreprises et (3) adressé aux entreprises un et parfois plusieurs ordres de service de rappel au respect des clauses contractuelles.

Tableau 16 : Nombre d'ouvrages réceptionnés par province

Province	Ouvrages				
	Ecole Primaire	Centre de Santé	Espace à Vives	Latrines Publiques	Bâtiment de la Régie Provinciale
Kasaï Central	4	5	4	30	1
Kasaï	1	1	1	6	
Kwilu	5	6	5	20	
Kwango	4	1	4	11	
Mai-Ndombe	2	2	2	8	
TOTAL	16	15	16	75	1

Le tableau ci-dessus présente le cumul du nombre par type d'ouvrages scolaires, sanitaires et d'assainissement dont les travaux sont réceptionnés techniquement, provisoirement ou définitivement du début du projet au 31 mars 2026, et cela par province.

Tableau 17 : Nombre d'emplois temporaires créés par les travaux réceptionnés

N°	N° CONTRAT	ENTREPRISE	NOMBRE D'EMPLOIS TEMPORAIRES CREEES			DATE DE COLLECTE
			HOMME	FEMME	TOTAL	
1. PROVINCE DU KASAI CENTRAL						
1	4	GCK	59	10	69	30-janv-26
2	17	RAM CONSTRUCT	53	33	86	27-févr-26
3	18	Ets ASPHAR	71	15	86	09-févr-26
4	19	ADIMIREC	144	49	193	05-mars-26
5	21	ENTRASCO	55	60	115	06-fév-2026

N°	N° CONTRAT	ENTREPRISE	NOMBRE D’EMPLOIS TEMPORAIRES CREEES			DATE DE COLLECTE
			HOMME	FEMME	TOTAL	
Total Kasai Central			382	167	549	
2. PROVINCE DU KASAI						
1	49	CODIBAKAV	45	30	75	17-mars-26
Total emplois temporaires Kasai			45	30	75	
3. PROVINCE DU KWILU						
1	24	SOCIETE LUKU	46	5	51	30-nov-25
2	25	GROUP MDL/CAPS Engineering Sarl	24	3	27	10-févr-26
3	26	GROUP MDL/CAPS Engineering Sarl	24	3	27	10-févr-26
4	27	SOCIETE LUKU	16	2	18	30-nov-25
5	28	BUREAU ETRE				10-févr-26
6	29	BUREAU ETRE				10-févr-26
Total emplois temporaires Kwilu			110	13	123	
4. PROVINCE DU KWANGO						
1	39	SCC	28	15	43	17-mars-26
2	54	RTM				
3	63	POWER	40	22	62	24-déc-25
Total emplois temporaires Kwango			68	37	105	
5. PROVINCE DE MAI-NDOMBE						
1	30	GEBAC	64	15	79	17-mars-26
2	31	GEBAC	71	4	75	17-mars-26
Total emplois temporaires Mai-Ndombe			135	19	154	
Total Général emplois temporaires			740	266	1 006	

Le tableau ci-dessus présente le nombre d'emplois temporaires créés par les travaux de construction des écoles primaires, centres de santé, espaces à vivres, latrines publiques et bâtiment de la régie provinciale du service public de l'eau. Il s'agit uniquement des travaux dont les ouvrages sont réceptionnés au 31 mars 2026.

Parmi les travailleurs temporaires, 74 % sont des hommes tandis que 26 % sont des femmes. Les hommes ont travaillé comme des ouvriers tous travaux, maçons, charpentiers, peintres, plombiers et électriciens. Les femmes quant à elles ont servi dans le puisage de l'eau de gâchage et la préparation des repas aux ouvriers, pour la plupart des chantiers.

La province du Kasai Central vient en tête par rapport au nombre d'emplois temporaires créés et est suivie de celle du Mai-Ndombe. Il reste cependant évident que le nombre d'emplois temporaires créés n'est pas fonction de l'envergure des travaux réalisés ou du nombre des contrats par province.

Les données contenues dans le tableau proviennent des listes de paie des différents ingénieurs de chantier et pourront augmenter ultérieurement lors que trois (03) parmi les entreprises dont les travaux sont achevés communiqueront leurs données respectives.

Tableau 18 : Répartition des travaux en cours par province

N°	N° du Contrat	Entreprise	Taux physique au 31 décembre 2025	Taux physique au 31 mars 2026	Commentaires
1. PROVINCE DU KASAI CENTRAL					
01	020	ENTRASCO	79 %	85 %	Le Comité Provincial de Coordination et Suivi du Projet délocalise le Site de Kabuluanda pour le Site de Bena Kayembe pour la construction de l'école, des latrines et du marché ensuite le Site de Tshibungu pour la construction du centre de santé Tshibangu.
2. PROVINCE DU KASAI					
01	022	AGIES	58 %	70 %	Défaillance de l'entreprise et mauvaise organisation du travail sur les chantiers.
02	023	AGIES	40 %	47 %	Défaillance de l'entreprise, mauvaise organisation du travail sur les chantiers et approvisionnement difficile des chantiers suite au mauvais état du chemin de fer.
03	055	GVRD	25 %	28 %	Défaillance de l'entreprise, mauvaise organisation du travail sur les chantiers et approvisionnement difficile des chantiers suite au mauvais état de la route.
3. PROVINCE DU KWANGO					
01	038	SERRU-TOP	65 %	74 %	Défaillance de l'entreprise, mauvaise organisation du travail sur les chantiers, et approvisionnement des chantiers par motos et pirogues suite au mauvais état de la route.
4. PROVINCE DE MAI-NDOMBE					
01	032	SCC	57 %	65 %	Travaux délocalisés des sites de Massambio et Kinsele en territoire de Kwamouth vers le site de Mbie Kasai en territoire de Kutu suite à l'insécurité causée par la milice Mobondo et, approvisionnement des chantiers en matériels et matériaux par la seule voie fluviale peu praticable sur certains tronçons.

Le tableau ci-dessus présente le taux d'exécution physique des travaux en cours entre le 31 décembre 2025 et le 31 mars 2026. Il s'observe un très grand ralentissement des travaux pour trois (03) entreprises sur les six (06) en retard et une performance de moins de 10 % sur les trois (03) autres entreprises durant le premier trimestre 2026.

Cependant, l'arrêt des travaux du contrat 055 a été constaté lors de la mission de suivi et contrôle du 22 février 2026 et un procès-verbal a été dressé à cet effet. Un chronogramme d'achèvement devrait être fourni par l'entreprise et des pénalités contractuelles devront être appliquées.

Les commentaires dans le tableau révèlent les raisons du retard des travaux malgré l'approvisionnement et la reprise progressive des travaux vers la fin du mois de mars 2026, cela après les recommandations formulées aux entreprises à l'occasion des missions de suivi et contrôle.

IV.4.2. Création d'emplois

Tableau 19 : Nombre d'emplois temporaires créés par les travaux en cours

N°	N° CONTRAT	ENTREPRISE	EMPLOIS TEMPORAIRES CREEES			DATE DE COLLECTE
			HOMME	FEMME	TOTAL	
1. PROVINCE DU KASAI CENTRAL						
1	20	ENTRASCO	40	35	75	06-févr-26
Total Kasai Central			40	35	75	
2. PROVINCE DU KASAI						
1	22	AGIES	17	3	20	11-févr-26
2	23	AGIES	112	6	118	11-févr-26
3	55	GVRD	67	34	101	10-févr-26
Total emplois temporaires Kasai			196	43	239	
3. PROVINCE DU KWANGO						
1	38	SERRU-TOP	74	14	88	26-mars-26
Total emplois temporaires Kwango			74	14	88	
4. PROVINCE DE MAI-NDOMBE						
1	32	SCC	86	14	72	09-mars-26
Total emplois temporaires Mai-Ndombe			86	14	72	
Total Général			396	106	474	

Le tableau ci-dessus présente le nombre d'emplois temporaires créés par les travaux de construction/réhabilitation des écoles primaires, centres de santé, espaces à vivres et latrines publiques. Les ouvriers utilisés à ce jour pour la majorité des travaux déjà réalisés ont servi dans l'avancement des gros œuvres. Les chiffres avancés devront cependant évoluer au fur et à mesure de l'avancement des travaux qui nécessiteront des technicités spécifiques telles que les charpentiers, les peintres, les électriciens et les plombiers.

Le nombre d'emplois temporaires créés pour les hommes est plus élevé par rapport à ceux créés pour les femmes. Ces dernières ont servi dans le puisage de l'eau de gâchage, l'approvisionnement des chantiers en matériaux et matériels et la préparation des repas en faveur des ouvriers sur les chantiers.

IV.5. ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES DANS LE POOL EST

IV.5.1. Travaux de construction des écoles primaires, centres de santé, espaces à vivres, latrines publiques et bâtiment de la régie provinciale du service public de l'eau

Cette section présente les activités de la sous-composante des infrastructures d'éducation, de santé et d'assainissement. Elle revient sur les travaux qui ont été réalisés du début du projet au 31 mars 2026 avec une attention particulière sur les travaux achevés au premier trimestre 2026.

Tableau 20 : Répartition des travaux réceptionnés par province

N°	N° du Contrat	Entreprise	Date de réception	Observation
1. PROVINCE DU KASAI ORIENTAL				
01	007	SOZOKA SARL	13/09/2024 28/11/2025	Réception provisoire Réception définitive
02	010	SAF SARL	25/09/2025 -	Réception Provisoire Réception Définitive
03	011	SAF SARL	02/12/2025 -	Réception Provisoire Réception Définitive
04	016	GCK SARL	04/12/2025 -	Réception Provisoire Réception Définitive
2. PROVINCE DE LOMAMI				
01	009	MBK CO	11/03/2025 -	Réception Provisoire Réception Définitive
02	012	SAF SARL	25/09/2025 -	Réception Provisoire Réception Définitive
03	013	SAF SARL	01/12/2025 -	Réception Provisoire Réception Définitive
04	042	SOZOKA SARL	08/03/2025 -	Réception Provisoire Réception Définitive
3. PROVINCE DU SANKURU				

N°	N° du Contrat	Entreprise	Date de réception	Observation
01	050	SAGEC-KAT	25/02/2026 -	Réception Provisoire Réception Définitive
4. PROVINCE DE HAUT LOMAMI				
01	036	SAM SARL	19/04/2025 -	Réception Provisoire Réception Définitive
02	037	SOZOKA SARL	08/03/2025 -	Réception Provisoire Réception Définitive
03	035	JET SARL	10/03/2025 -	Réception Provisoire Réception Définitive
5. PROVINCE DE MANIEMA				
01	051	ECBG	25/01/2025 28/02/2026	Réception Provisoire Réception Définitive
02	052	SAGEC-KAT	28/02/2026 -	Réception Provisoire Réception Définitive
03	053	SAGEC-KAT	15/12/2025 -	Réception Provisoire Réception Définitive

Un total cumulé des 15 sur 22 contrats des travaux de construction des écoles primaires, centres de santé, espaces à vivres, latrines publiques a vu les travaux réceptionnés du début du projet au 31 mars 2026, cela sur l'ensemble des cinq provinces du Pool Est.

Sur l'ensemble des 15 contrats dont les travaux sont réceptionnés à ce jour, les travaux des deux (02) contrats l'ont été provisoirement au premier trimestre 2026.

Tableau 21 : Types d'ouvrages réceptionnés pour le Pool Est

Type d'ouvrage	Prévision du projet	Cumul de réalisations au 31 décembre 2025	Réalisations au premier trimestre 2026		Cumul de réalisations au 31 mars 2026	
		Réalisés	Prévus	Réalisés	Réalisés	Pourcentage
Ecoles Primaires	21	13	8	2	15	71 %
Centres de Santé	20	12	8	2	14	70 %
Espaces à Vivres	21	13	8	2	15	71 %
Latrines Publiques	110	63	47	16	79	72 %
Taux moyen d'achèvement						71 %

Le tableau ci-dessus présente le nombre cumulé des ouvrages complètement construits jusqu'à leur réception provisoire et/ou définitive. Au premier trimestre 2026, il est à noter que les travaux des deux (02) contrats ont connu leur réception provisoire par rapport à la prévision trimestrielle. Ces travaux sont constitués des deux écoles primaires, deux espaces à vivres, deux centres de santé et huit latrines publiques. Ce qui porte le taux moyen d'achèvement à 71 % pour l'ensemble des ouvrages légers dans le Pool Est du projet.

Tableau 22 : Nombre cumulé d'ouvrages réceptionnés par province

Province	Total cumulé des ouvrages réalisés			
	Ecole Primaire	Centre de Santé	Espace à Vivres	Latrines Publiques
Kasaï Oriental	4	3	4	25
Lomami	4	4	4	26
Sankuru	1	1	1	4
Haut Lomami	3	3	3	12
Maniema	3	3	3	12
TOTAL	15	14	15	79

Le tableau ci-dessus présente le nombre cumulé par type d'ouvrages scolaires, sanitaires et d'assainissement dont les travaux sont réceptionnés provisoirement et/ou définitivement du début du projet au 31 mars 2026, et cela par province.

IV.5.2. Création d'emplois pour les travaux réceptionnés

Tableau 23 : Nombre d'emplois temporaires créés par les travaux réceptionnés

N°	N° CONTRAT	ENTREPRISE	NOMBRE D'EMPLOIS TEMPORAIRES CREES			DATE DE COLLECTE
			HOMME	FEMME	TOTAL	
1. PROVINCE DU KASAI ORIENTAL						
1	7	SOZOKA SARL	69	8	77	20/01/2026
2	10	SAF SARL	76	15	91	21/01/2026
3	11	SAF SARL	68	6	74	22/01/2026
4	16	GCK SARL	58	10	68	23/01/2026
Total Kasaï Oriental			271	39	310	
2. PROVINCE DE LA LOMAMI						
1	9	MBK CO	80	10	90	10/01/2026

2	12	SAF SARL	75	8	83	11/01/2026
3	13	SAF SARL	64	15	79	12/01/2026
4	42	SOZOKA SARL	84	5	89	13/01/2026
Total Lomami			303	38	341	
3. PROVINCE DU SANKURU						
1	50	SAGEC-KAT	64	4	68	19/01/2026
Total Sankuru			64	4	68	
4. PROVINCE DE HAUT LOMAMI						
1	36	SAM SARL	77	6	83	14/01/2026
2	37	SOZOKA SARL	87	13	100	15/01/2026
3	35	JET SARL	69	11	80	16/01/2026
Total Haut Lomami			233	30	263	
5. PROVINCE DU MANIEMA						
1	51	ECBG	66	6	72	17/01/2026
2	52	SAGEC-KAT	68	7	75	18/01/2026
3	53	SAGEC-KAT	65	8	73	19/01/2026
Total Maniema			199	21	220	
Total Général Emplois Temporaires			1070	132	1202	

Le tableau ci-dessus présente le nombre d'emplois temporaires créés par les travaux de construction des écoles primaires, centres de santé, espaces à vivres, latrines publiques. Il s'agit uniquement des travaux dont les ouvrages sont réceptionnés au 31 mars 2026.

Parmi les travailleurs temporaires, 89 % sont des hommes tandis que 11 % sont des femmes. Les hommes ont travaillé comme des ouvriers tous travaux, maçons, charpentiers, peintres, plombiers et électriciens. Les femmes quant à elles ont servi dans le puisage de l'eau de gâchage, le transport des matériaux/matériels et la préparation des repas aux travailleurs, pour la plupart des chantiers. La province Lomami vient en tête par rapport au nombre d'emplois temporaires créés et est suivie de celle du Kasai Oriental. Ces nombres sont cependant proportionnels au nombre des contrats dont les travaux sont achevés et à l'envergure des travaux réalisés.

Les données contenues dans le tableau proviennent des listes de paie des différents ingénieurs de chantier ou des services administratifs et financiers des entreprises

Tableau 24 : Répartition des travaux en cours par province

N°	N° du Contrat	Entreprise	Taux physique au 31 décembre 2025	Taux physique au 31 mars 2026	Observation
1. PROVINCE DU KASAI ORIENTAL					
01	008	SERRU TOP	51 %	53 %	Défaillance de l'entreprise et approvisionnement difficile des chantiers suite au mauvais état de la route.
02	014	GCK SARL	72 %	72 %	L'E.P a été délocalisée à Buakana. L'Espace à Vivres de Badibanga a été délocalisé pour celui de Bena Mpeta.
03	015	GCK SARL	72 %	77 %	Délocalisation du C.S de Mulowayi pour celui de Katumanga et l'E.P Cikelenge par l'E.P Tshisekedi. Les travaux qui étaient en arrêt depuis plus d'un mois ont repris timidement.
04	040	LATOIR	76 %	88 %	Travaux repris depuis 12 Septembre 2025 (Cf. PV de constat de reprise des travaux).
2. PROVINCE DE LOMAMI					
01	041	SOGITRAP	69 %	80 %	Défaillance de l'entreprise et approvisionnement difficile des chantiers suite au mauvais état de la route.
3. PROVINCE DU SANKURU					
01	033	SCICO SARL	56 %	63 %	Défaillance de l'entreprise et approvisionnement difficile des chantiers suite au mauvais état de la route.
02	034	SCICO SARL	61 %	64 %	Défaillance de l'entreprise et approvisionnement difficile des chantiers suite au mauvais état de la route.

Le tableau ci-dessus présente le taux d'exécution physique des travaux en cours entre le 31 décembre 2025 et le 31 mars 2026. Il s'observe que les travaux pour plus de 70 % des chantiers ont connu un ralentissement considérable au premier trimestre 2026.

Dans les commentaires du tableau se trouvent quelques raisons du retard des travaux malgré l'approvisionnement des chantiers en matériels et matériaux et la reprise progressive des travaux vers la fin du mois de mars 2026.

Des efforts considérables devront être fournis par les entreprises en retard d'achèvement en vue de rattraper les délais déjà impartis pour toutes les entreprises dont les travaux se poursuivent encore. Pour y faire face après des missions de suivi et contrôle, le projet a (1) exigé aux entreprises de fournir un chronogramme d'achèvement des travaux actualisé, (2) appliqué les pénalités de retard et (3)

adressé aux entreprises un ou plusieurs ordres de service de rappel au respect des clauses contractuelles.

IV.5.3. Création d'emplois pour les travaux en cours

Tableau 25 : Nombre d'emplois temporaires créés par les travaux en cours

N°	N° CONTRAT	ENTREPRISE	NOMBRE D'EMPLOIS TEMPORAIRES CREES			DATE DE COLLECTE
			HOMME	FEMME	TOTAL	
1. PROVINCE DU KASAI ORIENTAL						
1	8	SERRU TOP	34	6	40	24/01/2026
2	14	GCK SARL	48	12	60	25/01/2026
3	15	GCK SARL	36	4	40	26/01/2026
4	40	LATOUR	42	8	50	27/01/2026
Total Kasai Oriental			160	30	190	
2. PROVINCE DE LA LOMAMI						
1	41	SOGITRAP	39	7	46	24/01/2026
Total Lomami			39	7	46	
3. PROVINCE DU SANKURU						
1	33	SCICO SARL	62	8	70	25/01/2026
2	34	SCICO SARL	58	12	70	26/01/2026
Total Sankuru			120	20	140	
Total Général			368	63	431	

Le tableau ci-dessus présente le nombre d'emplois temporaires générés par les travaux de construction/réhabilitation des écoles primaires, centres de santé, espaces à vivres et latrines publiques. Les manœuvres et ouvriers utilisés à ce jour pour la majorité des travaux ont servi dans l'avancement des gros œuvres. Les chiffres avancés devront cependant évoluer au fur et à mesure de l'accélération des travaux qui nécessiteront des technicités spécifiques telles que les charpentiers, les peintres, les électriciens et les plombiers.

Les emplois temporaires créés pour les hommes sont plus nombreux par rapport à ceux créés pour les femmes. Ces dernières ont servi dans le puisage de l'eau de gâchage, le transport des matériaux et matériels et la préparation des repas en faveur des travailleurs sur les chantiers.

IV.6. ACHEVEMENT DES OUVRAGES DE 2025 A 2026

Tableau 26 : Achèvement des ouvrages du Projet PRISE II en 2025

N°	Activités/travaux	Prévisions totales PRISE (Nombres prévus)	Réalisation au 31 / 12 /2025		
			Réalisé	En cours de réalisation	Taux d'achèvement (%)
	TRAVAUX				
1	Espaces à vivres	40	28	12	70 %
2	Bâtiments scolaires	41	28	13	68 %
3	Centres de santé	40	26	14	65 %
4	Latrines Publiques	207	135	72	65 %
5	Mini réseaux d'AEP en milieu rural	22	0	19	0 %
6	Bureaux provinciaux des Régies de service public d'eau potable	2	1	1	50 %

Tableau 27 : Achèvement des ouvrages du Projet PRISE II au 31 mars 2026

N°	Activités/travaux	Prévisions totales PRISE (Nombres prévus)	Réalisations physiques au 31 mars 2026		
			Réalisé	En cours de réalisation	Taux d'achèvement (%)
	TRAVAUX				
1	Espaces à vivres	40	31	9	78 %
2	Bâtiments scolaires	41	31	10	76 %
3	Centres de santé	40	29	11	73 %
4	Latrines Publiques	207	154	53	74 %
5	Mini réseaux d'AEP en milieu rural	22	0	19	0 %
6	Bureaux provinciaux des Régies de service public d'eau potable	2	1	1	50 %

Entre le 31/12/2025 et le 31/03/2026, le taux d'achèvement moyen des ouvrages de Bâtiments scolaires, Centres de santé, Espaces à vivres et Latrines publiques est passé de 67 % à 75 %.

Pour les mini réseaux d'AEP, les travaux n'ont été terminés dans aucun site, toutefois le taux d'exécution physique moyen des travaux est passé de 20 à 22 %.

IV.7. REALISATION PHYSIQUE ET FINANCIERE DES TRAVAUX LEGERES EN COURS AU 31 MARS 2026

Tableau 28 : Répartition des travaux en cours par province et leurs taux d'exécution

N°	N° du Contrat	Entreprise	Taux physique	Taux de paiement
1. PROVINCE DU KASAI ORIENTAL				
01	008	SERRU TOP	53 %	47 %
02	014	GCK SARL	72 %	72 %
03	015	GCK SARL	77 %	72 %
04	016	GCK SARL	93 %	90 %
05	040	LATOUR	88 %	63 %
2. PROVINCE DE LOMAMI				
01	041	SOGITRAP	80 %	82 %
3. PROVINCE DU SANKURU				
01	033	SCICO SARL	63 %	50 %
02	034	SCICO SARL	64 %	47 %
4. PROVINCE DE HAUT LOMAMI				
01	035	JET SARL	97 %	91 %
5. PROVINCE DE MANIEMA				
01	053	SAGEC-KAT	85 %	86 %
Taux moyen			77 %	70 %

Tableau 29 : Répartition des travaux en cours par province et leurs taux d'exécution

N°	N° du Contrat	Entreprise	Taux physique	Taux de paiement
1. PROVINCE DU KASAI CENTRAL				
01	020	ENTRASCO	85 %	87 %
2. PROVINCE DU KASAI				
01	022	AGIES	70 %	67 %
02	023	AGIES	47 %	30 %
03	055	GVRD	28 %	61 %
3. PROVINCE DU KWANGO				
01	038	SERRU-TOP	74 %	55 %
4. PROVINCE DE MAI-NDOMBE				
01	032	SCC	65 %	57 %
Taux moyen			62 %	60 %

Globalement, le taux d'exécution physique des contrats en cours est de 71 % tandis que celui du paiement pour les mêmes travaux est de 66 %.

IV.8. EQUIPEMENT DES OUVRAGES

IV.8.1. Ouvrages scolaires

Tableau 30 : Nombre des mobiliers scolaires par catégorie

Catégorie de mobiliers scolaires	Nombre des mobiliers scolaires prévus	Total cumulé des mobiliers scolaires au 31 décembre 2025		Total mobiliers scolaires au premier trimestre 2026		Total cumulé des mobiliers scolaires au 31 mars 2026
		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	
Bancs pupitres	6 300	6 300	4 350	1 950	450	4 800
Tables	252	252	174	78	18	192
Armoires	252	252	174	78	18	192
Chaises	252	252	174	78	18	192

Le tableau ci-dessus présente le nombre cumulé des mobiliers scolaires par catégorie. Il renseigne le nombre croissant des mobiliers scolaires dotés aux bénéficiaires proportionnellement au nombre d'écoles dont les travaux sont réceptionnés.

IV.8.2. Ouvrages de santé

La livraison des matériels médicaux et des médicaments essentiels a démarré au troisième trimestre 2025 et s'est poursuivie au premier trimestre 2026. A cette période, un nombre cumulé de 33 centres de santé sur les 40 (dont 18 au Pool Ouest et 15 au Pool Est), ont été équipés en matériels médicaux et médicaments. Parmi ces 33 Centres de Santé, 18 sont totalement équipés tandis que 15 le sont partiellement. Les centres de santé dont les travaux sont en voie de réception assurent le stockage dans leur ancienne structure.

En ce qui concerne les équipements pour les maternités des hôpitaux généraux choisis par le concours du Secrétariat Général de la Santé Publique, le contrat a démarré en septembre 2025 et la livraison des équipements à 6 maternités a été clôturée en janvier 2026. Les maternités des hôpitaux généraux ci-après ont été dotées : Kenge, Bandundu Ville, Tshikapa, Kananga, Kabeya Kamwanga et Kabinda.

IV.9. TRAVAUX DES SYSTEMES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

Cette section présente l'évolution des activités de construction de forages, châteaux d'eau, mini-réseaux d'eau potable et points de distribution au premier trimestre 2026. Les activités sont présentées par site et par province en vue de bien appréhender les défis spécifiques qui se posent et les solutions plausibles capables de favoriser le respect des exigences contractuelles par les différentes parties prenantes aux contrats des travaux d'AEP dans les provinces du Kasai, Kasai Central, Kwilu, Kasai Oriental, Sankuru et Maniema.

IV.9.1. Exécution des travaux d'AEP

Tableau 31 : Répartition des contrats de construction des systèmes d'AEP par site

N°	Contrat	Entreprise	Province	Site	Date contractuelle de démarrage	Date de remise des sites
01	068	SZTC	Kasai Oriental	Tshilundu		03/04/2025
				Mukeba		04/04/2025
				Mulowayi		05/04/2025
				Bena Kabinda		06/04/2025
02	069	SAGEC-KAT	Sankuru	Djalo		02/6/2025
				Mukumari		03/06/2025
				Bakwa Bumba		04/06/2025
03	070	SAGEC-KAT	Maniema	Difuma 2		06/06/2025
				Lowe		07/06/2025
				Kibombo		08/06/2025
04	072	SZTC	Kasai Central	Luekeshi	03/04/2025	29/05/2025
				Luambo		02/06/2025
				Kalamba Mbuji		04/06/2025
05	071	SZTC	Kasai	Loange	03/04/2025	07/05/2025
				Kamuesha		09/05/2025
				Kabambayi Secteur		10/05/2025
06	073	CGC	Kwilu	Mukedi	03/04/2025	26/03/2025
				Kwenge		28/03/2025
				Masamuna		28/03/2025

Le tableau ci-dessus présente les différents sites des travaux de construction des systèmes des mini-réseaux d'eau potable, les dates prévisionnelles de démarrage des travaux ainsi que les dates de remise effective des sites aux différentes entreprises adjudicataires des travaux.

Les travaux de forages et de construction de mini-réseaux d'alimentation en eau potable sont répartis dans les provinces du Kasai, Kasai Central et Kwilu en raison de trois centres ruraux par province, dans le Pool Ouest et les provinces du Kasai Oriental (4 sites), Sankuru (3 sites) et Maniema (3 sites), dans le Pool Est. Les travaux s'exécutent actuellement sur 19 sites situés dans des villages dont les communautés sont parmi les plus vulnérables de la zone du projet.

Les entreprises ci-dessous sont des adjudicataires de travaux de construction de forages, châteaux d'eau, mini-réseaux et points de distribution.

A. Entreprise SZTC, Contrat N°068, Lot 1 au Kasai Oriental

L'avancement physique des travaux exécutés par l'entreprise SZTC (Lot 1) est détaillé dans le tableau ci-dessous :

Tableau 32 : Etat d'avancement physique des travaux de SZTC, Contrat N°068

N° de série	Description	Taux d'avancement %
Série 1	Installation de chantier et travaux préparatoires	67,5 %
Série 2	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Tshilundu	30 %
Série 3	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Mukeba	13 %
Série 4	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Mulowayi	1 %
Série 5	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Bena Kabinda	0 %
Avancement Global du Lot 1 SZTC		18 %

- **Ecart technique dans l'avancement physique des travaux de l'entreprise SZTC, Contrat N°068_Lot 1**

À la date du 31 mars 2026, l'avancement physique cumulé des travaux a évalué à 18 %, tandis que l'avancement temporel contractuel atteint 46 %. Il en résulte un écart négatif de 28 %, correspondant à un retard estimé à environ 6 mois par rapport au planning approuvé.

Des correspondances de relance ont été adressées à l'entreprise en vue d'une mobilisation accrue des ressources humaines et matérielles, ainsi que la mise en œuvre de mesures correctives additionnelles destinées à accélérer le rythme d'exécution et à résorber le retard accumulé.

L'analyse des causes met en évidence que la principale contrainte à l'origine de ce décalage significatif demeure la problématique de disponibilité de la ressource en eau, impactant directement la planification et la cadence des travaux.

- **Ecart financier de l'entreprise SZTC, Contrat N°068_ Lot 1 (Kasaï Oriental)**

Tableau 33 : Evolution de paiement des factures

N° Contrat	Montant	Paiement cumulé en \$ au 31/12/2025	Taux au 31 décembre 2025	Paiement cumulé en \$ au 31 mars 2026	Taux au 31 mars 2026
068	3 381 983,53	1 054 292,47	31 %	1 366 862,88	40 %

Au 31 mars 2026, le décaissement financier prévisionnel était estimé à 46 % tandis que le décaissement réel a atteint 40 %, soit un écart négatif de 6 % entre les prévisions financières et les paiements effectivement réalisés à cette date.

L'analyse de l'évolution des décaissements montre que les paiements ont été engagés de manière anticipée dès les premiers mois des travaux. En effet, le taux de décaissement avait déjà atteint 31% en décembre 2025. Cette mobilisation financière est expliquée par l'avance de démarrage de 20% du coût global du contrat ainsi que la prise en compte du transport des conduites et des accessoires de l'usine jusqu'aux chantiers.

Il sied de souligner par ailleurs que le niveau actuel de décaissement (40%) apparaît supérieur à l'avancement physique réel des travaux (18%). Cette situation traduit un déséquilibre entre l'exécution financière et l'avancement physique des travaux.

Des efforts considérables devraient être fournis par l'entreprise en vue du respect des exigences contractuelles, cela en dépit des difficultés rencontrées.

B. Entreprise SAGEC-KAT, Contrat N°069, Lot 2 (Sankuru)

Tableau 34 : Etat d'avancement physique des travaux de SAGEC-KAT, Contrat N°069

N° de série	Description	Taux d'avancement %
Série 1	Installation de chantier et travaux préparatoires	84 %
Série 2	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Djalo	12 %

Série 3	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Mukumari	18,5 %
Série 4	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Bakwa Bumba	1 %
Avancement Global du Lot 2 SAGEC-KAT		21%

- **Ecart technique dans l'avancement physique des travaux de l'entreprise SAGEC-KAT, Contrat N°069_ Lot 2**

Au 31 mars 2026, l'avancement physique des travaux dans le Sankuru est estimé à 21 %, contre un avancement temporel de 46 %, soit un retard global de 25 %, équivalant à environ 6 mois par rapport au planning contractuel.

Face à cette situation, des courriers de relance ont été adressés à l'entreprise, l'enjoignant à renforcer de manière significative la mobilisation de ses ressources et à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires afin d'accélérer le rythme d'exécution et de résorber le retard constaté.

Ce retard s'explique principalement par des contraintes liées à la disponibilité de la ressource en eau ainsi qu'à des difficultés logistiques.

- **Écart Financier de l'entreprise SAGEC-KAT, Contrat N°069_ Lot 2 (Sankuru)**

Tableau 35 : Evolution de paiement des factures

N° Contrat	Montant	Paiement cumulé en \$ au 31/12/2025	Taux au 31 décembre 2025	Paiement cumulé en \$ au 31 mars 2026	Taux au 31 mars 2026
069	2 555 335	1 478 477,12	57,85 %	1 478 477,12	57,85 %

Au 31 mars 2026, le décaissement prévisionnel était estimé à 46 % tandis que le décaissement réel a atteint 57,85 %, soit un écart négatif de 11,85 % entre les prévisions financières et les paiements effectivement réalisés à cette date.

L'analyse de l'évolution des décaissements montre que les paiements ont été engagés de manière anticipée dès les premiers mois des travaux et ont stagnés au premier trimestre 2026. Cette mobilisation financière est expliquée par l'avance de démarrage et la prise en compte du transport des conduites et des accessoires de l'usine jusqu'aux chantiers.

Il sied de souligner par ailleurs que le niveau actuel de décaissement (57,85 %) apparaît nettement supérieur à l'avancement physique réel des travaux (21 %). Cette situation traduit un déséquilibre important entre l'exécution financière et l'avancement physique des travaux. D'où, des efforts considérables qui devraient être fournis en vue du respect des exigences contractuelles techniques et financières, cela en dépit des difficultés de terrain.

C. Entreprise SAGEC-KAT, Contrat N°070, Lot 3 (Maniema)

Tableau 36 : Etat d'avancement physique des travaux de SAGEC-KAT, Contrat N°070

N° de série	Description	Taux d'avancement %
Série 1	Installation de chantier et travaux préparatoires	49 %
Série 2	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Difuma 2	21 %
Série 3	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Lowe	23 %
Série 4	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Kibombo (site de remplacement de Tunda)	19 %
Avancement Global du Lot 3 SAGEC-KAT		25 %

NB : Nous signalons que le centre de Kibombo a connu la réalisation de deux forages au lieu d'un, comme indiqué dans le contrat de l'entreprise.

• Ecart technique dans l'avancement physique des travaux de l'entreprise SAGEC-KAT, Contrat N°070_Lot 3

Au 31 mars 2026, l'avancement physique des travaux dans le Sankuru est estimé à 25 %, contre un avancement temporel de 50 %, soit un retard global de 25 %, équivalant à environ 6 mois par rapport au planning contractuel.

La performance globale de l'avancement physique est jugée insatisfaisante. Des mesures correctives urgentes, notamment l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de rattrapage opérationnel, sont nécessaires afin de rétablir un niveau d'exécution conforme aux objectifs du projet. Les causes du retard sont entre autres liés à la logistique, les ressources humaines, l'approvisionnement de chantier et la lenteur dans la production des dossiers d'études.

• Écart Financier de l'entreprise SAGEC-KAT pour le Lot 3

Tableau 37 : Evolution de paiement des factures

N° Contrat	Montant	Paie ment cumulé en \$ au 31/12/2025	Taux au 31 décembre 2025	Paie ment cumulé en \$ au 31 mars 2026	Taux au 31 mars 2026
070	2 512 215,00	1 507 260,18	60 %	1 507 260,18	60 %

L'examen du suivi des décaissements met en évidence un écart persistant et significatif entre les prévisions et les réalisations sur toute la période allant d'avril 2025 à mars 2026.

Le décaissement réel atteint 60 %, tandis que le prévisionnel était de 50 %, traduisant un décalage important dès la phase initiale. Cette situation suggère une mobilisation anticipée des ressources financières liée au paiement d'avances de démarrage ou à des engagements contractuels précoces notamment la prise en compte de l'avance de démarrage et du transport des conduites et des accessoires de l'usine jusqu'aux chantiers.

Il sied cependant de signaler que le taux d'exécution physique reste nettement inférieur au taux de paiement, ce qui suggère d'aligner les prévisions et l'exécution effective du point de vue technique et financier.

D. Entreprise SZTC, Contrat N°071_Lot 1(Kasai)

Tableau 38 : Etat d'avancement physique des travaux de SZTC, Contrat N°071_Lot 1

N° de série	Description	Taux d'avancement %
Série 1	Installation de chantier et travaux préparatoires	81 %
Série 2	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Kamuesha	44 %
Série 3	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Loange	33 %
Série 4	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Kabambayi Secteur	24 %
Avancement Global du Lot 1 SZTC		42 %

- **Ecart technique dans l'avancement physique des travaux de l'entreprise SZTC, Contrat N°071_Lot 1**

Au 31 mars 2026, l'avancement prévisionnel des travaux était estimé à 45,8 % tandis que l'avancement physique réel a atteint 42 %, soit un écart positif de 42,59 % par rapport au planning contractuel, soit près d'un mois de moins (acceptable).

- **Ecart financier de l'entreprise SZTC, Contrat N°071_Lot 1**

Tableau 39 : Evolution de paiement des factures

N° Contrat	Montant	Paiement cumulé en \$ au 31/12/2025	Taux au 31 décembre 2025	Paiement cumulé en \$ au 31 mars 2026	Taux au 31 mars 2026
71	2 942 138,63	1 040 251,26	35 %	1 728 437,52	59 %

Au 31 mars 2026, le décaissement financier prévisionnel était estimé à 38 % tandis que le décaissement réel a atteint 59 %, soit un écart positif significatif entre les prévisions financières et les paiements effectivement réalisés à cette période.

L'analyse de l'évolution des décaissements montre que les paiements ont été engagés de manière anticipée dès les premiers mois des travaux. En effet, le taux de décaissement avait déjà atteint 35% en décembre 2025.

Par ailleurs, il convient de souligner que le niveau actuel de décaissement (59 %) apparaît supérieur à l'avancement physique réel des travaux, estimé à 42 %. Cette situation traduit une incohérence relative entre l'exécution financière et l'avancement physique des travaux.

Cette mobilisation financière est en partie expliquée par l'avance de démarrage de 20 % du coût global du contrat ainsi que la prise en compte du transport des conduites et des accessoires de l'usine jusqu'aux chantiers.

E. Entreprise SZTC, Contrat N°072_Lot 2 (Kasai Central)

Tableau 40 : Etat d'avancement physique des travaux de SZTC, Contrat N°072_Lot 2

N° de série	Description	Taux d'avancement %
Série 1	Installation de chantier et travaux préparatoires	46 %
Série 2	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Luambo	20 %
Série 3	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Luekeshi	17 %
Série 4	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Kalamba Mbuji	16 %
Avancement Global du Lot 2 SZTC		22 %

- **Ecart technique dans l'avancement physique des travaux de l'entreprise SZTC, Contrat N°072_Lot 2**

Au 31 mars 2026, l'avancement prévisionnel des travaux était estimé à 38 % tandis que l'avancement physique réel n'a atteint qu'environ 22 %, soit un écart négatif de 16 % par rapport au calendrier contractuel, soit environ 4 mois de retard.

Cet écart traduit un retard significatif et il convient de noter que depuis avril jusqu'à septembre 2025, aucun avancement physique n'a été enregistré malgré une progression prévisionnelle continue, ce qui a entraîné l'accumulation d'un retard structurel dès les premières phases des travaux.

Bien que deux tentatives de forage en octobre 2025 aient été négatives à Luekeshi (l'aménagement des deux sources d'eau à capter est envisagée avec des études préalables), le rythme d'exécution demeure nettement insuffisant au regard des objectifs planifiés.

Il convient de noter qu'au cours du premier trimestre 2026, plusieurs dispositions ont été prises afin de résorber le retard accumulé. Ces mesures se traduiraient par la mise en œuvre des actions suivantes :

- La reprise des travaux de forage sur les trois sites en tenant compte des toutes les éventualités des études géophysiques réalisées de chaque site,
- L'achèvement complète des travaux de construction et d'aménagement de la base-vie à Kananga,
- La mise en place systématique des équipes et des moyens techniques nécessaires dès qu'un forage est réalisé positif en vue d'enchaîner sans délai les activités subséquentes et d'accélérer le rattrapage du retard.

• **Ecart financier de l'entreprise SZTC, Contrat N°072_ Lot 2**

Tableau 41 : Evolution de paiement des factures

N° Contrat	Montant	Paiement cumulé en \$ au 31/12/2025	Taux au 31 décembre 2025	Paiement cumulé en \$ au 31 mars 2026	Taux au 31 mars 2026
72	3 591 585,03	980 763,16	27 %	1 378 730,58	38 %

Au 31 mars 2026, le décaissement financier prévisionnel était estimé à 38 % tandis que le décaissement réel a atteint 38 %, ce qui indique un alignement global entre les prévisions financières et les paiements qui ont été effectués. Cette mobilisation financière est consécutive à l'avance de démarrage de 20 % du coût total du contrat ainsi que la prise en compte du transport des conduites et des accessoires de l'usine jusqu'aux chantiers.

Il convient de souligner que ce niveau de décaissement, bien qu'atteignant 38 %, n'est pas cohérent avec l'avancement physique réel des travaux (22 %). Une vigilance est de mise afin d'assurer une cohérence continue entre les décaissements et l'avancement physique réel des travaux, cela en dépit des difficultés des ressources et logistiques rencontrées.

F. Entreprise CGC, Contrat N°073_Lot 3 (Kwilu)

Tableau 42 : Etat d'avancement physique des travaux de CGC, Contrat N°073_Lot 3

N° de série	Description	Taux d'avancement %
Série 1	Installation de chantier et travaux préparatoires	74 %
Série 2	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Kwenge	41 %
Série 3	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Mukedi	32 %
Série 4	Travaux des forages et mini-réseaux, châteaux d'eau + branchements à Masamuna	36 %
Avancement Global du Lot 3 CGC		47 %

- **Ecart technique dans l'avancement physique des travaux de l'entreprise CGC, Contrat N°073_Lot 3**

Au 31 mars 2026, l'avancement prévisionnel des travaux était estimé à 38 % tandis que l'avancement physique réel a atteint 47 %. Cet écart significatif traduit une avance dans l'exécution de certaines activités notamment celles liées aux travaux de génie civil et la fourniture des conduites. Cette situation résulte d'une mobilisation satisfaisante des ressources humaines et matérielles de l'entreprise ainsi que d'une bonne organisation des interventions sur le chantier. Il s'agit d'un avancement des travaux considéré comme globalement conforme au planning contractuel.

- **Ecart financier de l'entreprise CGC, Contrat N°073_Lot 3**

Tableau 43 : Evolution de paiement des factures

N° Contrat	Montant	Paiement cumulé en \$ au 31/12/2025	Taux au 31 décembre 2025	Paiement cumulé en \$ au 31 mars 2026	Taux au 31 mars 2026
73	3 052 291,32	1 111 318,57	36 %	1 962 652,50	64%

Au 31 mars 2026, le décaissement financier réel a atteint 64 % alors que le prévisionnel était de 38%, soit un écart financier positif significatif.

IV.9.2. Création d'emplois

N°	N° CONTRAT	ENTREPRISE	EMPLOIS TEMPORAIRES CREEES			DATE DE COLLECTE
			HOMME	FEMME	TOTAL	
PROVINCE DU KASAI ORIENTAL						
1	68	SZTC	30	0	30	21/02/2026
Total emplois temporaires Kasai Oriental			30	0	30	
PROVINCE DU SANKURU						
2	69	SAGEC-KAT	18	4	22	25/02/2026
Total emplois temporaires Sankuru			18	4	22	
PROVINCE DU MANIEMA						
3	70	SAGEC-KAT	22	6	28	23/02/2026
Total emplois temporaires Maniema			22	6	28	
Total Général			70	10	80	

N°	N° CONTRAT	ENTREPRISE	EMPLOIS TEMPORAIRES CREES			DATE DE COLLECTE
			HOMME	FEMME	TOTAL	
PROVINCE DU KASAI CENTRAL						
1	71	SZTC	20	0	20	24-févr-26
Total emplois temporaires Kasai Central			20	0	20	
PROVINCE DU KASAI						
2	72	SZTC	25	0	25	23-févr-26
Total emplois temporaires Kasai			25	0	25	
PROVINCE DU KWILU						

N°	N° CONTRAT	ENTREPRISE	EMPLOIS TEMPORAIRES CREEES			DATE DE COLLECTE
			HOMME	FEMME	TOTAL	
3	73	CGC	47	3	50	23-févr-26
Total emplois temporaires Kwilu			47	3	50	
Total Général			92	3	95	

Les tableaux N°44 et N°45 ci-dessus présentent le nombre d'emplois temporaires déjà créés par les travaux de construction de forages, châteaux d'eau potable, mini-réseaux et points de distribution, dans les provinces du Kasai Oriental, Sankuru, Maniema, Kasai, Kasai Central et Kwilu. Ces données ont été fournies par les Environnementalistes dédiés aux activités sur les chantiers et sont susceptibles d'augmenter positivement au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Le nombre global des travailleurs temporaires utilisés à ce jour reflète le niveau d'avancement des travaux qui, pour la majorité, ont consisté à la poursuite de la foration sur plus de 80 % des sites. Ce type de travail a été réalisé par le personnel clé qualifié et les travailleurs permanents des entreprises concernées. Cela explique en partie la faible utilisation des femmes pour les travaux réalisés. La suite du travail qui consistera au démarrage des travaux de génie civil (château d'eau, loge gardien, mur de clôture et local technique), pose des canalisations y compris les accessoires, augmentera certes le nombre des travailleurs temporaires sur l'ensemble des sites.

IV.10. REALISATIONS FINANCIERES DU PRISE II AU 31 MARS 2026

Tableau 46 : Détail des réalisations au 31 mars 2026

N°	Activités	Budget en USD au taux de 1 UC = 1,36 USD	Engagement Total au 31/12/2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en UC	Décaissements 2023 en UC	Décaissements 2024 en UC	Décaissements 2025 en UC	Décaissement au T1 2026 en UC	Total décaissements au 31 mars 2026 en UC	Taux de décaissement T1-PTBA 2026 en UC
			('1)	('2)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)=('3+4+5+6)	('8) = ('6)/('2)
Composante A. DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES											
	Catégorie Biens										
1	Acquisition des mobiliers scolaires	743 026,35	217 569,70	217 569,35	152 146,40	0	168 265,42	232 360,49	16432,3073	417 058,22	11%
2	Acquisition des équipements médicaux	2 175 668,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1175409,392	0	1 175 409,39	
	Sous total /catégorie Biens	2 918 694,58	217 569,70	217 569,35	152 146,40	0,00	168 265,42	1 407 769,88	16 432,31	1 592 467,61	11%
	Catégorie travaux										
1	Construction des mini-réseaux d'AEP en milieu rural	21 342 016,18	10 211 970,10	10 211 970,10	7 141 237,83	0	0	5 352 161,11	1 291 246,18	6 643 407,30	18%
2	Construction des Bureaux pour les régies provinciales	482 186,57	110 000,00	110 000,00	76 923,08	0	143 055,34	77 418,22	0,00	220 473,55	0%

N°	Activités	Budget en USD au taux de 1 UC = 1,36 USD	Engagement Total au 31/12/2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en UC	Décaissements 2023 en UC	Décaissements 2024 en UC	Décaissements 2025 en UC	Décaissement au T1 2026 en UC	Total décaissements au 31 mars 2026 en UC	Taux de décaissement T1-PTBA 2026 en UC
			('1)	('2)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)=('3+4+5+6)	('8) = ('6)/('2)
3	Réhabilitation et Construction des Ecoles primaires ; des Centres de Santé ; des latrines et la construction des Espaces à vivres.	28 393 667,85	5 742 650,00	5 742 650,00	4 015 839,16	2599911,015	9 790 874,56	3 529 226,55	1 204 516,89	17 124 529,02	30%
	Sous total /catégorie Travaux	50 217 870,60	16 064 620,10	16 064 620,10	11 234 000,07	2 599 911,01	9 933 929,90	8 958 805,88	2 495 763,08	23 988 409,87	22%
	Catégorie service										
1	Contrôle et surveillance des travaux AEP Rural	3 630 167,09	2 699 068,50	2 699 068,50	1 887 460,49	0	0	0	315251,10	315251,10	17%
2	Campagne d'IEC	1 117 448,72	1 117 448,72	335 234,62		0	0	0	0	0	
	Sous total/Catégorie service	4 747 615,81	3 816 517,22	3 034 303,12	1 887 460,49	0,00	0,00	0,00	315 251,10	315 251,10	17%
	Sous Total coût de base de la Composante A	57 884 180,99	20 098 707,02	19 316 492,57	13 273 606,96	2 599 911,01	10 102 195,32	10 366 575,76	2 827 446,48	25 896 128,58	21%
Composante B. ETUDES ET RENFORCEMENT DES CAPACITES											
	Catégorie Biens										
1	Matériel roulant	765 458,73	217 569,70	217 569,70	152 146,64	0	51 347,45	316 758,04	0,00	368 105,49	0%

N°	Activités	Budget en USD au taux de 1 UC = 1,36 USD	Engagement Total au 31/12/2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en UC	Décaissements 2023 en UC	Décaissements 2024 en UC	Décaissements 2025 en UC	Décaissement au T1 2026 en UC	Total décaissements au 31 mars 2026 en UC	Taux de décaissement T1-PTBA 2026 en UC
			('1)	('2)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)=('3+4+5+6)	('8) = ('6)/('2)
2	Mobilier de bureaux	82 634,29	0,00	0,00	0,00	0	59 503,65	0	0	59 503,65	
3	Matériels Informatiques	54 752,05	0,00	0,00	0,00	0	39 372,26	0	0	39 372,26	
	Equipements Divers										
4	Equipements techniques de terrain et de recherche hydrologique pour la Direction des Ressources en Eau	163 008,08		116 060,78	81 161,38	0	1,37	0	0	1,37	0%
5	Equipement de dix (10) maternités des régions ciblées	95 886,30		95 508,98	66 789,50	0	0,00	0	0	0,00	0%
6	Distribution de 10 000 foyers améliorés	95 886,30		93 000,00	65 034,97	0	0	0	0	0,00	0%
	Sous total /catégorie Biens	1 257 625,75	217 569,70	522 139,46	365 132,49	0,00	150 224,73	316 758,04	0,00	466 982,77	0%
	Catégorie service										
	Renforcement des capacités des acteurs										
1	Formation des jeunes en plomberie et entretien des ouvrages d'AEP	274 000,00	274000,00	210000,00	146853,15	0	0	0	0	0	0%

N°	Activités	Budget en USD au taux de 1 UC = 1,36 USD	Engagement Total au 31/12/2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en UC	Décaissements 2023 en UC	Décaissements 2024 en UC	Décaissements 2025 en UC	Décaissement au T1 2026 en UC	Total décaissements au 31 mars 2026 en UC	Taux de décaissement T1-PTBA 2026 en UC
			('1)	('2)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)=('3+4+5+6)	('8) = ('6)/('2)
	Sous total renforcement des capacités des acteurs	274 000,00	274 000,00	210 000,00	146 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Etudes et assistance aux réformes du secteur AEPA										
1	Actualisation du Plan National AEPA, Etude de la gestion (technique, économique, institutionnelle et financière) patrimoniale des ouvrages d'eau potable et d'assainissement dans le milieu rural et installation d'un SIG (DIAR) + études géophysiques et EIES pour l'élaboration des APD des mini-réseaux dans 10 provinces de la RDC	1 414 019,47	1414019,47	565607,79	395529,9231	0	0	0	0	0	0%
2	Etude pour l'élaboration et l'opérationnalisation de la stratégie de gestion des déchets solides	479 500,00	479500,00	143850,00	100594,41	0	0	0	0	0	0%

N°	Activités	Budget en USD au taux de 1 UC = 1,36 USD	Engagement Total au 31/12/2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en UC	Décaissements 2023 en UC	Décaissements 2024 en UC	Décaissements 2025 en UC	Décaissement au T1 2026 en UC	Total décaissements au 31 mars 2026 en UC	Taux de décaissement T1-PTBA 2026 en UC
			('1)	('2)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)=('3+4+5+6)	('8) = ('6)/('2)
3	Enquête d'impact socio-économique et de satisfaction des bénéficiaires des ouvrages réalisés par le Projet PRISE II	431 489,72	431489,72	129446,92	90522,32168	0	0	0	0	0	0%
4	Formation sur le logiciel de gestion financière	15 338,52		15985,42	11178,61538	0	0	0	0	0	0%
5	Suivi du plan de gestion environnemental	205 500,00		214167,00	149767,13	0	0	0	0	0	0%
	Sous total/Catégorie service	2 819 847,71	2 599 009,19	1 279 057,13	894 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Sous Total coût de base de la Composante B	4 077 473,46	2 816 578,89	1 801 196,59	1 259 578,03	0,00	150 224,73	316 758,04	0,00	466 982,77	0%
Composante C. COORDINATION ET GESTION DE PROJET.											
	Catégorie service										
1	Honoraires Consultants ponctuels du projet	445 321,61	102 750,00	80 000,00	55 944,06	0	38 310,95	64 719,16	8 234,40	111 264,51	15%
2	Audit des Comptes	311 631,16		30 000,00	20 979,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3	Audit Environnemental et Social	215 744,86	215 744,86	39 000,00	27 272,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

[illegible]

N°	Activités	Budget en USD au taux de 1 UC = 1,36 USD	Engagement Total au 31/12/2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en UC	Décaissements 2023 en UC	Décaissements 2024 en UC	Décaissements 2025 en UC	Décaissement au T1 2026 en UC	Total décaissements au 31 mars 2026 en UC	Taux de décaissement T1-PTBA 2026 en UC
			('1)	('2)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)=('3+4+5+6)	('8) = ('6)/('2)
	Appui aux réformes du secteur de l'eau (Formation des cadres et agents du Secrétariat Général de Développement Rural et de la CSPP, appui aux ETD à la maîtrise d'œuvre, formations des cadres des régies financières, contractualisation de la gestion ; Formation Certifiante du Personnel Clé de PRISE (SPM, S-E, RAF) et de la CSPP en Management, PM Gestion, Suivi et Evaluation des Projets et Programmes ; Formation locale des ONG sur l'hygiène et la salubrité ; Formation des cadres du Min. Ressources Hydrauliques, Développement Rural et Agents du CNAEHA en gestion d'une base des données	3 162 905,30	1968217,35	1180930,41	825825,4615	0	0	0	0	0	0%

[illegible]

N°	Activités	Budget en USD au taux de 1 UC = 1,36 USD	Engagement Total au 31/12/2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en UC	Décaissements 2023 en UC	Décaissements 2024 en UC	Décaissements 2025 en UC	Décaissement au T1 2026 en UC	Total décaissements au 31 mars 2026 en UC	Taux de décaissement T1-PTBA 2026 en UC
			('1)	('2)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)=('3+4+5+6)	('8) = ('6)/('2)
	femmes) de la RDC ; Etude sur l'identification et la structuration des PME des femmes ; Appui au Ministère des Ressources Hydrauliques pour l'élaboration des mesures d'application de la Loi relative à l'Eau (deux Consultants), Assistance Technique aux Régies Provinciales dans la contractualisation de la gestion des ouvrages ; gestion environnementale et sociale.										
	Sous total fonctionnement	12 314 342,27	6 085 574,25	5 298 287,31	3 705 096,02	800 163,57	1 206 347,04	1 239 084,98	861 762,34	4 107 357,92	23%
	Sous Total composante C	13 544 398,51	6 404 069,11	5 468 449,31	3 824 090,43	800 163,57	1 344 382,49	1 360 953,21	869 996,74	4 375 496,00	23%
	Total de base	75 506 052,96	29 319 355,02	26 586 138,47	18 357 275,42	3 400 074,58	11 596 802,54	12 044 287,01	3 697 443,22	30 738 607,35	20%
	Imprévus physiques	390 577,04	0	0		0					
	Hausse de prix	508 270,00	0	0		0					
	TOTAL GENERAL	76 404 900,60	29 319 355,02	26 586 138,47	18 357 275,42	3 400 074,58	11 596 802,54	12 044 287,01	3 697 443,22	30 738 607,35	20%



L'exécution financière en Unité de Compte du PRISE II est de 61,48 % du budget global et de 20 % du PTBA 2026, au premier trimestre 2026. Pour une prévision budgétaire annuelle de 18 357 275,42 UC ; 3 697 443,22 UC ont été décaissés au 31 mars 2026 ramenant ainsi le décaissement total cumulé à 30 738 607,35 UC.

Sachant que 5 770 000 UC équivalent à près de 10 % du coût global du budget correspondant à la Contrepartie du Gouvernement, rien n'a été mobilisé au premier trimestre 2026. De ce qui précède, le taux cumulatif de décaissement par rapport au budget global uniquement sur le PRET FAD équivaut à 30 738 607,35 UC a atteint 61,48 % au 31 mars 2026

Tableau 47 : Taux d'exécution financière au 31 mars 2026 par composante

N°	Projet/ Composante	Financement			Engagement	Réalisation du PRISE II au 31 mars 2026					
		Budget en USD au taux de 1 UC = 1,36 USD	Prévisions des décaissements 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en UC	Engagement Total au 31/12/2026 en USD	Décaissements 2023 en UC	Décaissements 2024 en UC	Décaissements 2025 en UC	Décaissement au T1 2026 en UC	Total décaissements au 31 mars 2026 en UC	Taux de décaissement T1-PTBA 2026 en UC
		('1)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)	('8)	('9)=('5+6+7+8)	('9) = ('8)/('3)
A	Infrastructures d'AEP, Sanitaires, et Scolaires	57 884 180,99	19 316 492,57	13 273 606,96	20 098 707,02	2 599 911,01	10 102 195,32	10 366 575,76	2 827 446,48	25 896 128,58	21 %
B	Etudes et Renforcement des Capacités	4 077 473,46	1 801 196,59	1 259 578,03	2 816 578,89	0,00	150 224,73	316 758,04	0,00	466 982,77	0 %
C	Coordination et Gestion du Projet	13 544 398,51	5 468 449,31	3 824 090,43	6 404 069,11	800 163,57	1 344 382,49	1 360 953,21	869 996,74	4 375 496,00	23 %
	Total de base	75 506 052,96	26 586 138,47	18 357 275,42	29 319 355,02	3 400 074,58	11 596 802,54	12 044 287,01	3 697 443,22	30 738 607,35	20 %
	Imprévus physiques	390 577,04	0		0	0					
	Hausse de prix	508 270,00	0		0	0					
	TOTAL GENERAL	76 404 900,60	26 586 138,47	18 357 275,42	29 319 355,02	3 400 074,58	11 596 802,54	12 044 287,01	3 697 443,22	30 738 607,35	20 %

Le tableau ci-dessus présente les taux de décaissement par composante au premier trimestre 2026. Il renseigne que la composante B (Etudes et Renforcement des Capacités) n'a pas connu une réalisation financière à la période du rapport. Cela implique un retard dans le démarrage des activités de renforcement des capacités, d'études diverses et d'assistance aux réformes du secteur d'AEP. La préparation du démarrage de certaines parmi ces activités est en cours, la mobilisation de certains consultants et/ou experts ayant été lancé.

Tableau 48 : Taux d'exécution financière au 31 mars 2026 par catégorie

N°	Projet/ Catégorie	Financement			Engagement	Réalisation du PRISE II au 31 mars 2026					
		Budget en USD au taux de 1 UC = 1,36 USD	Prévisions des décaissements 2026 en USD	Prévisions des décaissements 2026 en UC	Engagement Total au 31/12/2026 en USD	Décaissements 2023 en UC	Décaissements 2024 en UC	Décaissements 2025 en UC	Décaissement au T1 2026 en UC	Total décaissements au 31 mars 2026 en UC	Taux de décaissement T1-PTBA 2026 en UC
		('1)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)	('8)	('9)=('5+6+7+8)	('9) = ('8)/('3)
1	Travaux	50 217 870,60	16 064 620,10	11234000,07	16 064 620,10	2 599 911,01	9 933 929,90	8 958 805,88	2 495 763,08	23 988 409,87	22%
2	Biens	4176320,33	739708,81	517278,89	435139,4	0	318 490,15	1724527,92	16432,31	2059450,38	3%
3	Services	8 797 519,76	4483522,25	2900900,44	6734021,27	0	138 035,45	121868,23	323485,5	583389,18	11%
4	Fonctionnement	12 314 342,87	5298287,31	3705096,02	6085574,25	800163,57	1206347,04	1239084,98	861762,34	4107357,92	23%
	Total de base	75 506 053,56	26 586 138,47	18 357 275,42	29 319 355,02	3 400 074,58	11 596 802,54	12 044 287,01	3 697 443,22	30 738 607,35	20%
	Imprévus physiques	390 577,04									
	Hausse de prix	508 270,00									
	TOTAL GENERAL	76 404 900,60	26 586 138,47	18 357 275,42	29 319 355,02	3 400 074,58	11 596 802,54	12 044 287,01	3 697 443,22	30 738 607,35	20%

Tableau 9 : Taux de l'exécution financière au 31 mars 2026 par source de financement

N°	Projet/Source de Financement	Financement		Engagement	Réalizations PRISE II au 31/03/2026					
		Budget en UC au taux de 1 UC = 1,36 USD	Budget/PTBA 2026 en UC	Niveau engagement total au 31/12/2026 en UC	Décaissements 2023 en UC	Décaissements 2024 en UC	Décaissements 2025 en UC	Décaissement au T1 2026 en UC	Total décaissements au 31 mars 2026 en UC	Taux de décaissement au T1-PTBA 2026
		('1)	('2)	('3)	('4)	('5)	('6)	('7)	('8)= ('4+5+6+7)	('9)= ('7)/('2)
1	Contrepartie du Gouvernement	5 770 000	1 540 585,24							
2	Prêt FAD/BAD	50 000 000	16 816 690,18	29 319 355,02	3 400 074,58	11 596 802,54	12 044 287,01	3 697 443,22	30 738 607,35	61,48 %
	Total de base	55 000 000	18 357 275,42	29 319 355,02	3 400 074,58	11 596 802,54	12 044 287,01	3 697 443,22	30 738 607,35	

V.I. SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

V.1.1. Cadre de sauvegarde environnementale et sociale

Le projet PRISE II est classé en Catégorie 2 au regard des exigences environnementales et sociales (E&S), impliquant des impacts potentiels localisés, spécifiques aux sites et maîtrisables à travers des mesures d'atténuation appropriées.

Un dispositif complet de gestion E&S a été élaboré et opérationnalisé conformément à la législation nationale congolaise et aux standards opérationnels de la Banque Africaine de Développement (BAD). Les principaux instruments de sauvegarde comprennent :

- 30 Études d'Impact Environnemental et Social (EIES) assorties de Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), validées par l'ACE (certificat environnemental délivré le 09 octobre 2021) et publiées par la BAD (02 novembre 2021).
- PGES-C (Plans de Gestion Environnementale et Sociale de Chantier) obligatoires pour chaque entreprise contractante.
- Matrice de Suivi Environnemental et Social (MSES) pour la consolidation des données de suivi.
- Rapports Mensuels de Mise en Œuvre Environnementale (RMMOE).
- Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) avec 27 Comités de Gestion des Plaintes (11 Pool-Est, 16 Pool-Ouest).
- Dispositifs spécifiques liés aux VBG et EAS/HS, intégrés dans les PGES-C avec codes de conduite et formations obligatoires.

Ce cadre constitue l'ossature opérationnelle de conformité et conditionne le démarrage légal des travaux.

V.1.2. Niveau d'avancement des mesures E&S (T4 – 2025)

V.1.2.1. Documentation et conformité administrative

- 51 PGES-C validés (100 % des contrats actifs).
- 27 certificats environnementaux délivrés.
- Tous les contrats intègrent des obligations E&S formelles.

La validation préalable des PGES-C est systématiquement exigée avant mobilisation des entreprises.

V.1.2.2. Performance environnementale et sociale des Entreprises contractantes

Sur les 51 contrats en cours d'exécution dans le Pool-Est et Pool-Ouest :

- 47 Contrats soit 92 % ont des performances satisfaisantes et
- 4 Contrats soit 8 % ont des performances peu satisfaisantes qui nécessitent l'amélioration.

Dans l'ensemble, les entreprises affichent une performance environnementale et sociale globalement satisfaisante, avec un taux d'appréciation estimé à 92 % contre 81 % au 31 décembre 2025. Ces résultats traduisent une appropriation progressive des exigences environnementales et sociales du projet. Néanmoins, certaines entreprises requièrent un encadrement technique et un suivi renforcé pour que les Non-conformités mineures relevées, soient corrigées (EPI, gestion des déchets, stockage de matériaux, etc.). À cet effet, des mesures correctives ciblées et graduelles seront mises en œuvre, dans une logique d'amélioration continue de la performance et de maîtrise durable des risques environnementaux et sociaux.

V.1.1.3. Gestion des plaintes (T1-2026)

- 17 comités opérationnels ;
- Un total cumulé de 18 plaintes sont enregistrées concernant principalement le retard de paiement des salaires de certains manœuvres dont 14 ont été jugées recevables et traitées et 4 ont été rejetées donc non fondées ;
- Un total cumulé de 8 plaintes sont enregistrées et traitées concernant principalement le retard de paiement des salaires de certains manœuvres ;
- Aucune plainte majeure susceptible d'affecter la viabilité du projet ;
- Le mécanisme fonctionne de manière structurée, avec traçabilité des dossiers ;
- Aucune plainte dite sensible n'a été enregistré ;
- Compte tenu de la caution élevée demandée par les opérateurs téléphoniques pour l'obtention du numéro vert, il est envisagé d'équiper chaque point focal du CMGP d'un moyen de communication en vue de faciliter les échanges et recueillir les éventuelles plaintes et doléances.

V.1.1.4. Sensibilisation et prévention des risques

- Un total cumulé de 118 (contre 88 au 31 décembre 2025) sessions de sensibilisation réalisées sur les chantiers ;
- Thématiques : sécurité au travail, EPI, hygiène, prévention VBG/VIH, gestion des déchets, bonnes pratiques environnementales ;
- Participation communautaire et implication des autorités coutumières encouragées ;
- La campagne d'IEC à grande échelle reste en attente de l'ANO de la BAD.

V.1.1.5. Emplois créés

Dans le volet social, le respect des exigences sociales a été mis en exergue en exhortant les entreprises à payer leurs personnels et mettre à leur disposition un traitement équitable. Les populations des différents sites se sont appropriées les réalisations du Projet PRISE II et en font un témoignage positif. Il y a eu création d'emplois temporaires du fait de l'utilisation de la main d'œuvre locale, environ 3 316 personnes dont 2 736 hommes et 580 femmes sont employés pour l'exécution des travaux, sans compter les fournisseurs des biens ou services et matériels locaux.

V.1.1.6. Supervision et coordination

- 6 missions de supervision E&S réalisées au T1/2026 ;
- Présence d'un environnementaliste dans chaque entreprise ;
- Coordination assurée par la CEP ;
- Consolidation régulière des données et rétroaction aux acteurs terrain.

V.1.3. Mise en œuvre des recommandations de la BAD (Mission nov. 2025)

L'état d'exécution des recommandations est globalement satisfaisant :

- Étude complémentaire E&S : Réalisation en continue sur les sites nécessitant une évaluation sommaire d'aménagement des sources d'eau (cas de Luekeshi) ; une mission de prospection environnementale a été réalisée, trouvant l'environnement physique et social du site de captage, le PGES jadis élaboré est resté maintenu.
- Gestion des plaintes : mise en œuvre effective (installation des CGP et reporting).
- Audit E&S 2023–2025 : Audit dont la réalisation et la présentation du rapport par le Consultant planifié pour le deuxième trimestre 2026.
- Sensibilisation (Campagnes IEC) : processus de recrutement du Consultant en cours ;
- PTBA 2026 : la sauvegarde Environnementale et sociale est prise en compte dans la planification des activités du projet.
- Conditions de travail : conformité contractuelle vérifiée (contrats formalisés, sensibilisation au respect du SMIG en vigueur).

V.1.4. Indicateurs clés de performance (ICP – T1/2026)

Tableau 49 : Indicateurs clés de performance

Thème	Indicateur	Valeur
PGES-C validés	Nombre total	51
Incidents majeurs	Cas	0
Plaintes enregistrées	Nombre	18
Comités de plaintes	Nombre	27
Sessions de sensibilisation	Nombre de session	118
Missions de supervision	Nombre	6
Entreprise performant	Nombre	47

V.1.5. Appréciation globale de conformité

À l'issue du premier trimestre 2026 :

- Les obligations E&S prévues dans la convention de financement sont globalement respectées ;
- Les outils de gestion sont opérationnels sur l'ensemble des sites actifs ;
- Les risques environnementaux et sociaux sont maîtrisés.

Le système de sauvegarde environnementale et sociale du PRISE II est pleinement opérationnel et structuré autour d'instruments réglementaires validés, d'un dispositif de suivi consolidé et d'un mécanisme de gestion des plaintes fonctionnel.

La performance E&S globale du Projet, estimée à 92 %, traduit un niveau de conformité satisfaisant au regard des exigences nationales et des standards de la BAD.

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE ET DES INDICATEURS DU PROJET AU T1-2026

VI.1. SUIVI DES INDICATEURS

Pendant le premier trimestre 2026, le Projet a connu les missions et des moments de conférence dont les principaux sont repris ci-après :

Tableau 50 : Activités de suivi de la mise en œuvre du projet

Mission	Période
Services de Consultant Individuel chargé de l'audit indépendant environnemental et social	Démarrage par la signature du contrat le 19 mars 2026
Audit des travaux par la Cour des Comptes	Préparation de la mission de terrain fin mars 2026
Mission d'accompagnement de Monsieur le Coordonnateur National à la conférence des Gouverneurs pour le partage d'expériences du PRISE sur l'adduction en eau potable dans le milieu rural à Bandundu Ville.	Du 20 au 29 mars 2026

Tableau 51 : Suivi des indicateurs du projet

Indicateur	Unité	Cible 2026	Total cumulé au T1	Taux de réalisation (%)	Écart
1. Nombre des systèmes d'AEP réalisés	Unités	19	0	0	19
1.1. Nombre des forages positifs réalisés	Unités	21	14	66,6	7
1.2. Nombre des châteaux d'eau réalisés	Unités	19	0	0	19
1.3. Nombre des Bornes Fontaines réalisés	Unités	163	0	0	163
1.4. Nombre des Branchements Particuliers réalisés	Unités	127	0	0	127
1.5. Longueur du réseau réalisé	Mètre linéaire	74765	14055	18,8	60710
2. Nombre d'infrastructures scolaires	Ecoles	41	31	76	10

Indicateur	Unité	Cible 2026	Total cumulé au T1	Taux de réalisation (%)	Écart
construites/réhabilitées et équipées					
2.1. Bancs fournis	Unités	6300	4800	78	1500
2.2. Tables fournies	Unités	252	192	78	60
2.3. Armoires fournis	Unités	252	192	78	60
2.4. Chaises fournies	Unités	252	192	78	60
3. Nombre d'infrastructures de santé construites/réhabilitées	Unités	40	28	70	12
4. Nombre des centres de santé équipés en matériels et médicaments	Lots	40	33	83	7
5. Nombre de latrines publiques réalisées (latrines publiques, centres de santé, espaces à vivres, écoles	Unités	210	135	64,3	75
6. Nombre d'espaces à vivres (marchés) construits	Unités	40	31	78	9
7. Nombre des bâtiments de régies provinciales de service public de l'eau construits et équipés	Bâtiment	2	0	50	1
8. Nombre d'emplois temporaires créés	Personne	1575	3 316	210 %	+1741
9. Nombre des services de maternité équipés	Unité	6	6	100	0
10. Nombre de foyers améliorés distribués	Unité	10000	0	0	10000

DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS ENVISAGEES

VII.1. DIFFICULTES

Au cours de l'exécution du Projet, depuis la signature des accords de financement, les difficultés suivantes ont été relevées :

- Mauvais état des routes qui mènent vers les sites des travaux ; ce qui rend l'accessibilité difficile pour le suivi des travaux et l'approvisionnement en matériaux et matériels ;
- L'insécurité dans une partie de la zone d'intervention du projet PRISE II avec le phénomène Mobondo dans la province de Kwango et Mai-Ndombe (une partie de l'ex Province de Bandundu) ;
- Retard dans l'obtentions des ANO de la BAD pour l'engagement des activités du projets ;
- Non-respect des délais contenus dans les chronogrammes des travaux, par certaines entreprises ;
- Non-respect, par certaines entreprises, des délais contenus dans les chronogrammes d'acquisition de certains biens ;
- Démarrage des travaux de mini réseaux d'AEP avant le recrutement de la mission de contrôle.

VII.2. SOLUTIONS

- Délocalisation de certains site des travaux de la zone d'insécurité vers une zone sécurisée ;
- Transmission régulière des instances des ANO à la CSPP/Finances ;
- Des recommandations sont régulièrement formulées par le projet aux entreprises par écrit et/ou par des réunions en présentiel en vue du respect des chronogrammes d'exécution des travaux ;
- Application des pénalités contractuelles aux entreprises défaillantes ;
- Les DPO et/ou fonctionnaires du Secrétariat General du Développement Rural ont été utilisés pour le renforcement du suivi des travaux d'infrastructure ;
- La Mission de contrôle des travaux de mini réseaux d'AEP a démarré ses prestations à partir du 8 décembre 2025, soit 7 mois après le démarrage des travaux pour les 6 contrats signés.

SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS AU PREMIER TRIMETRE 2026

A l'échéance du premier trimestre 2026, les résultats acquis en termes d'exécution physique, financière et conformité environnementale et sociale du projet sont comme suit :

- Le taux d'engagement total des activités et prestations du projet (Prêt et Contrepartie) est de 75% ;
- Taux d'engagement sur les Fonds du prêt FAD : 84% ;
- Taux d'engagement sur la Contrepartie du Gouvernement : 0% ;
- Le taux d'exécution physique global des activités et prestations du projet est de 52% ;
- Le taux d'achèvement des travaux de construction des Ecoles Primaires, Centres de Santé, Espaces à Vivres et Latrines Publiques a atteint 75 % ;
- Le taux moyen de décaissement sur le Fonds FAD au 31/3/2026 est de 61,48 % .
- Le taux global d'exécution financière par rapport au Plan de Travail et Budget Annuel 2026 a atteint 20 % ;
- Le taux global moyen d'exécution physique des travaux de construction des systèmes d'approvisionnement en eau potable a atteint 22 % ;
- Le taux global moyen d'exécution physique de l'ensemble des travaux légers (EP, CS, EV, LP) a atteint 91 % ;

Un total cumulé de 33 Ecoles Primaires sur les 42, soit 76 % ont été équipées des mobiliers scolaires constitués de 150 bancs, 6 tables, 6 chaises et 6 armoires, par école ;

Un total cumulé de 33 Centres de Santé sur les 40, soit 83 % ont été dotées d'équipements médicaux et médicaments ;

- Le nombre d'emplois temporaires créés par l'ensemble des travaux a atteint 3.316 dont 580 femmes et 2.736 hommes ;
- La performance Environnementale et Sociale globale du projet est estimée à 92 % traduisant ainsi un niveau de conformité satisfaisant ;

[illegible]

[illegible]
